



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



สวัสดีครับ



การจัดการความรู้
กรมชลประทาน





โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพั่นบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดิน





โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพน้ำบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



นายชเนทธิ สอนธิตา
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

Design Thinking กับการบริหารสัญญาจ้างเหมา
คบ.ปากพน้ำบน จากปี 2563 - 2566



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



คส.๒.๑

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนวนับท้ายคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๗ ๑๕๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	วุฒิ/สาขา	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม					ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย					ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
			ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่	เงินเดือน	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่	เงินเดือน		
๔๑	นายสำราญ ทุมบุญทริก	ปวส. (ช่างก่อสร้าง) ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)	นายช่างชลประทาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและ ปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาปากพยับบน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง ระบบชลประทาน)	ทั่วไป	อาวุโส	๔๘๕๕		นายช่างชลประทาน ฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาปากพยับล่าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ฝ่ายวิศวกรรม)	ทั่วไป	อาวุโส	๔๘๖๓		บัดนี้ เป็นต้นไป	โดยให้ได้รับ เงินเดือนใน ตำแหน่งที่ ได้รับแต่งตั้ง
๔๒	นายชนนท์ สอนลิลลา	ป.การ ชลประทาน วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)	นายช่างชลประทาน ฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาปากพยับล่าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ฝ่ายวิศวกรรม)	ทั่วไป	อาวุโส	๔๘๖๓		นายช่างชลประทาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและ ปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาปากพยับบน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง ระบบชลประทาน)	ทั่วไป	อาวุโส	๔๘๕๕		บัดนี้ เป็นต้นไป	โดยให้ได้รับ เงินเดือนใน ตำแหน่งที่ ได้รับแต่งตั้ง

๗๑



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การจัดการความรู้
Knowledge Management

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนนย้ายคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑ ๙๕๔ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

คส.๒.๑

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	วุฒิ/สาขา	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม					ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย					ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
			ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	เงินเดือน	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	เงินเดือน		
๔๖	นายชนนท์ สอนลีลา	ป.การ ชลประทาน วศ.บ. (วิศวกรรม ชลประทาน) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) บ.อ.ม. (การบริหารธุรกิจ)	นายช่างชลประทาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง ระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปากพยับบน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง ระบบชลประทาน)	ทั่วไป	อาวุโส	๔๘๘๕		นายช่างชลประทาน ฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปากพยับบน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ฝ่ายวิศวกรรม)	ทั่วไป	อาวุโส	๔๘๘๔		บัดนี้ เป็นต้นไป	โดยให้ได้รับ เงินเดือน ในตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง
๔๗	นายธีรวิทย์ เงินเปีย	วศ.บ. (วิศวกรรม ชลประทาน)	นายช่างชลประทาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒)	ทั่วไป	อาวุโส	๔๘๗๘		นายช่างชลประทาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง ระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปากพยับบน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง ระบบชลประทาน)	ทั่วไป	อาวุโส	๔๘๘๕		บัดนี้ เป็นต้นไป	โดยให้ได้รับ เงินเดือน ในตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง

(Handwritten signatures and initials)



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับขน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



Design Thinking กับการบริหารสัญญาจ้างเหมา คบ.ปากพยับขน จากปี 2563 - 2566



การจัดการความรู้
กรมชลประทาน





โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



สรุปการเบิกจ่าย งบ พรบ. ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564

ลำดับที่	ชื่องาน	งบประมาณ	วงเงินค่างบประมาณ	อายุสัญญา (วัน)	เลขที่สัญญา	ส่งเข้าทำงาน	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ผู้ควบคุมงาน	ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	ผู้ประกอบการ	เบิกจ่าย โครงการ + กั้นสำนักงาน			คงเหลือ	เหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค
														รวม	%	% ผลงาน		
12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน																	
1	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบายน้ำ D2 กม.2+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,958,832.00	2,886,832.00	120.00	สัญญาเลขที่ ปนบ./จ.07/2563 ลว.25 ส.ค.63	9 ก.ย. 63	12 ก.ย. 63	9 ม.ค. 64	นายสุจิต ศรีสังข์ นายศรศักดิ์ ภิรมย์ภักดี	นายประวีติ ชاکวานนท์	นายสมเกียรติ สอนลิลา	นายโพธิ์ กาญจนวัฒน์	บริษัท เค.ที.คอนสตรัคชั่น 202	2,933,695.70	99.15	100.00	25,136.30	
2	ปรับปรุงระบบคลองบางขน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเกาะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	3,003,960.00	2,952,360.00	120.00	สัญญาเลขที่ ปนบ./จ.08/2563 ลว.8 ก.ย.63	9 ก.ย. 63	13 ก.ย. 63	10 ม.ค. 64	นายโพธิ์ กาญจนวัฒน์ นายพงษ์พัฒน์ คงฤทธิ์	นายประวีติ ชاکวานนท์	นายสมเกียรติ สอนลิลา	นายสุจิต ศรีสังข์	พจก. พรหมเสถียร การโยธา	3,003,763.70	99.99	100.00	196.30	
3	แก้ปัญหาน้ำท่วมอาคารประกอบ โครงการน้ำลิ่งบ้านทุ่งหินโปง ความจุ 8.00 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลแหลม อำเภอบ้านพร จังหวัดนครศรีธรรมราช	64,826,505.00	63,800,005.00	180.00	สัญญาเลขที่ กจ.20/2563(สทค.) ลว.27 พ.ค.63	7 ต.ค. 63	11 ต.ค. 63	8 เม.ย. 64	นายโพธิ์ กาญจนวัฒน์ นายพงษ์พัฒน์ คงฤทธิ์	นายประวีติ ชاکวานนท์	นายสมเกียรติ สอนลิลา	นายสุชฌิมินทร์ จันทร์ภักดี	บริษัท ธรณีโคงจเจริญ คอนสตรัคชั่น จำกัด	49,532,695.48	76.41	81.00	15,293,809.52	เนื่องจากผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเครื่องมือเข้ามาปฏิบัติงานไม่ทันไปตามแผนที่กำหนดไว้รวมไปถึงขาดทักษะความชำนาญในการดำเนินการและฝนตกในพื้นที่ก่อสร้างทำให้ขาดต่อการขนย้ายดินไม่ถึง
4	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรือนชาวนา จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	19,658,950.00	19,500,000.00	150.00	สัญญาเลขที่ ปนบ./จ.02/2563 ลว.25 เม.ย.63	21 เม.ย. 63	25 เม.ย. 63	21 ก.ย. 63	นายโพธิ์ กาญจนวัฒน์ นายดาหวัน จันทร์หอม	นายประวีติ ชاکวานนท์	นายสมเกียรติ สอนลิลา	นายบัณฑิตวัฒน์ แสนชู	พจก.อนันต์นิมิต	156,177.80	0.79	75.00	19,502,772.20	เนื่องจากผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเครื่องมือเข้ามาปฏิบัติงานไม่ทันไปตามแผนที่กำหนดไว้รวมไปถึงขาดทักษะความชำนาญในการดำเนินการและเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ก่อสร้างทำให้ไม่สามารถดำเนินงานเกิดความล่าช้า
5	อาคารบังคับน้ำบ้านควนชะลิ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลควนชะลิ้ง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	5,522,650.00	5,444,250.00	120.00	สัญญาเลขที่ ปนบ./จ.06/2563 ลว.7 พ.ค.64	23 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63	20 พ.ย. 63	นายโพธิ์ กาญจนวัฒน์ นายประสิทธิ์ ทองสุรกิจ	นายประวีติ ชاکวานนท์	นายสมเกียรติ สอนลิลา	นายบัณฑิตวัฒน์ แสนชู	พจก. ส.สมชัยวิศวกรรม	5,522,593.30	100.00	100.00	56.70	

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชาวนา 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี
สัญญาเลขที่ ปนบ.จ.02/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
วงเงิน 19,500,000 บาท อายุสัญญา 150 วัน

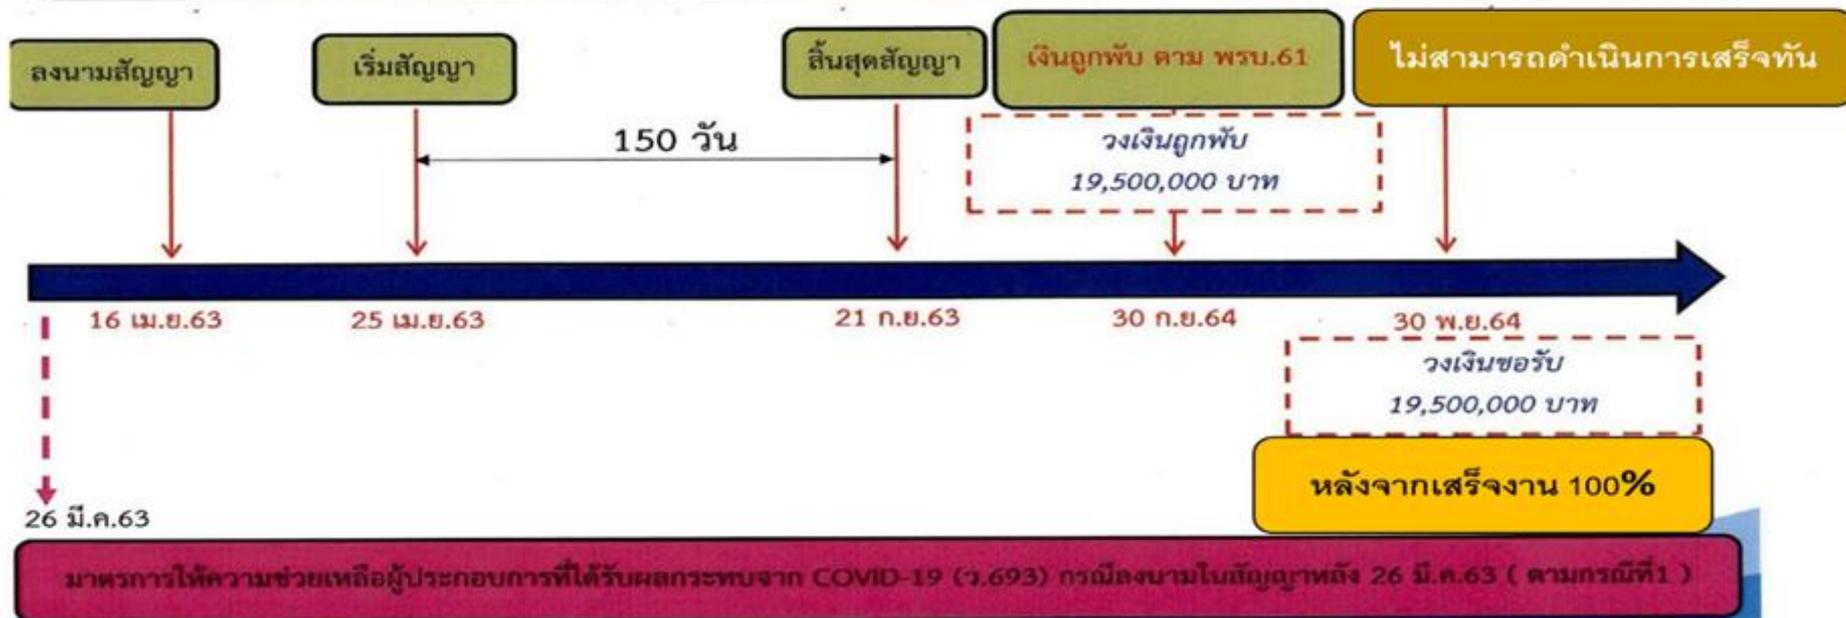



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



1.2.3 สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญา ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และยังมีได้ส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งมอบงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ


กรณีที่มีค่าปรับ สัญญาที่ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 และครบกำหนดหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565

จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช


สัญญาเลขที่ ปนบ/จ.02/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินงบประมาณตามสัญญา 19,500,000 บาท


อายุสัญญา 150 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 25 เมษายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะกรรมการฯตรวจรับงานวันที่ 6 มิถุนายน 2565

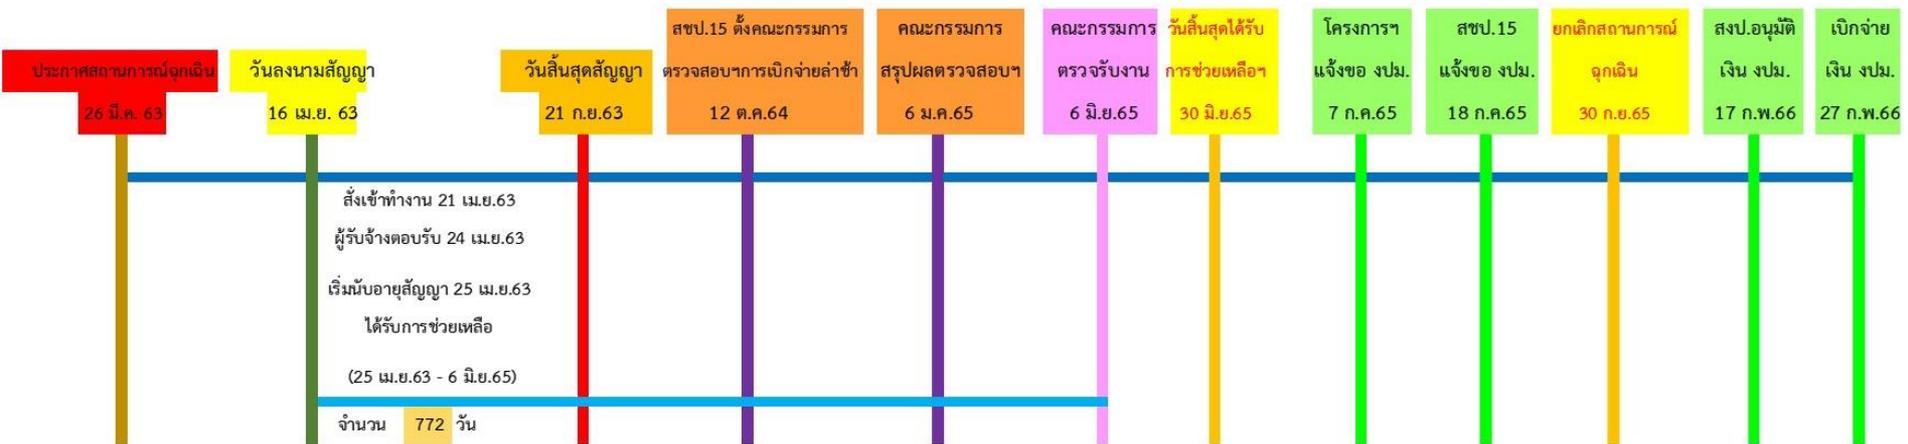



Speed Design Thinking with 3 Core Concept

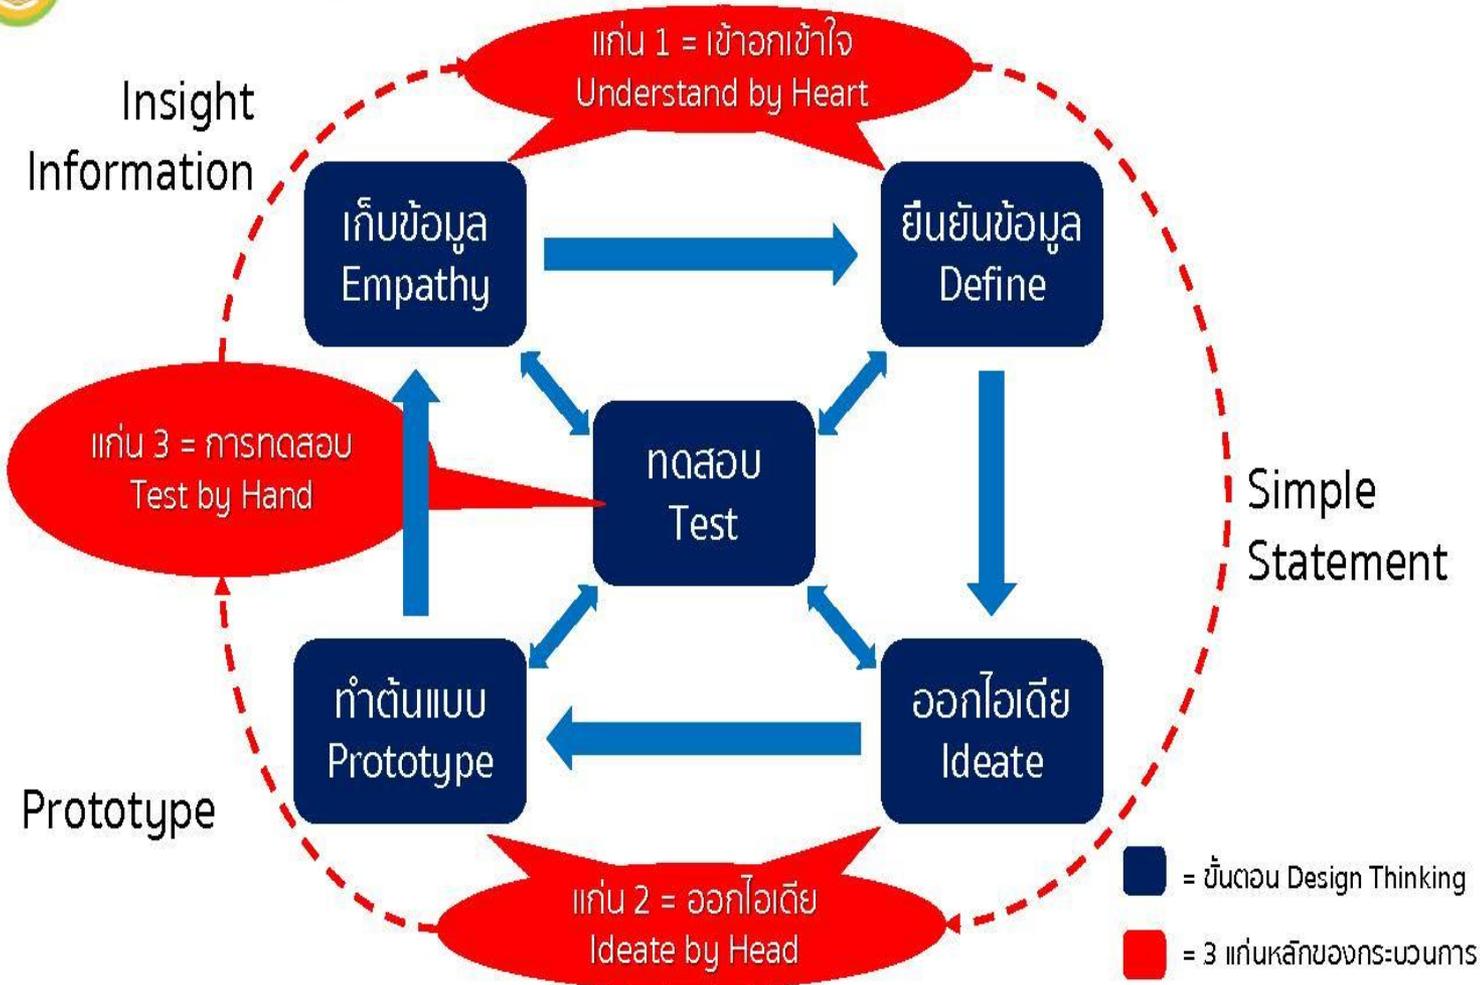


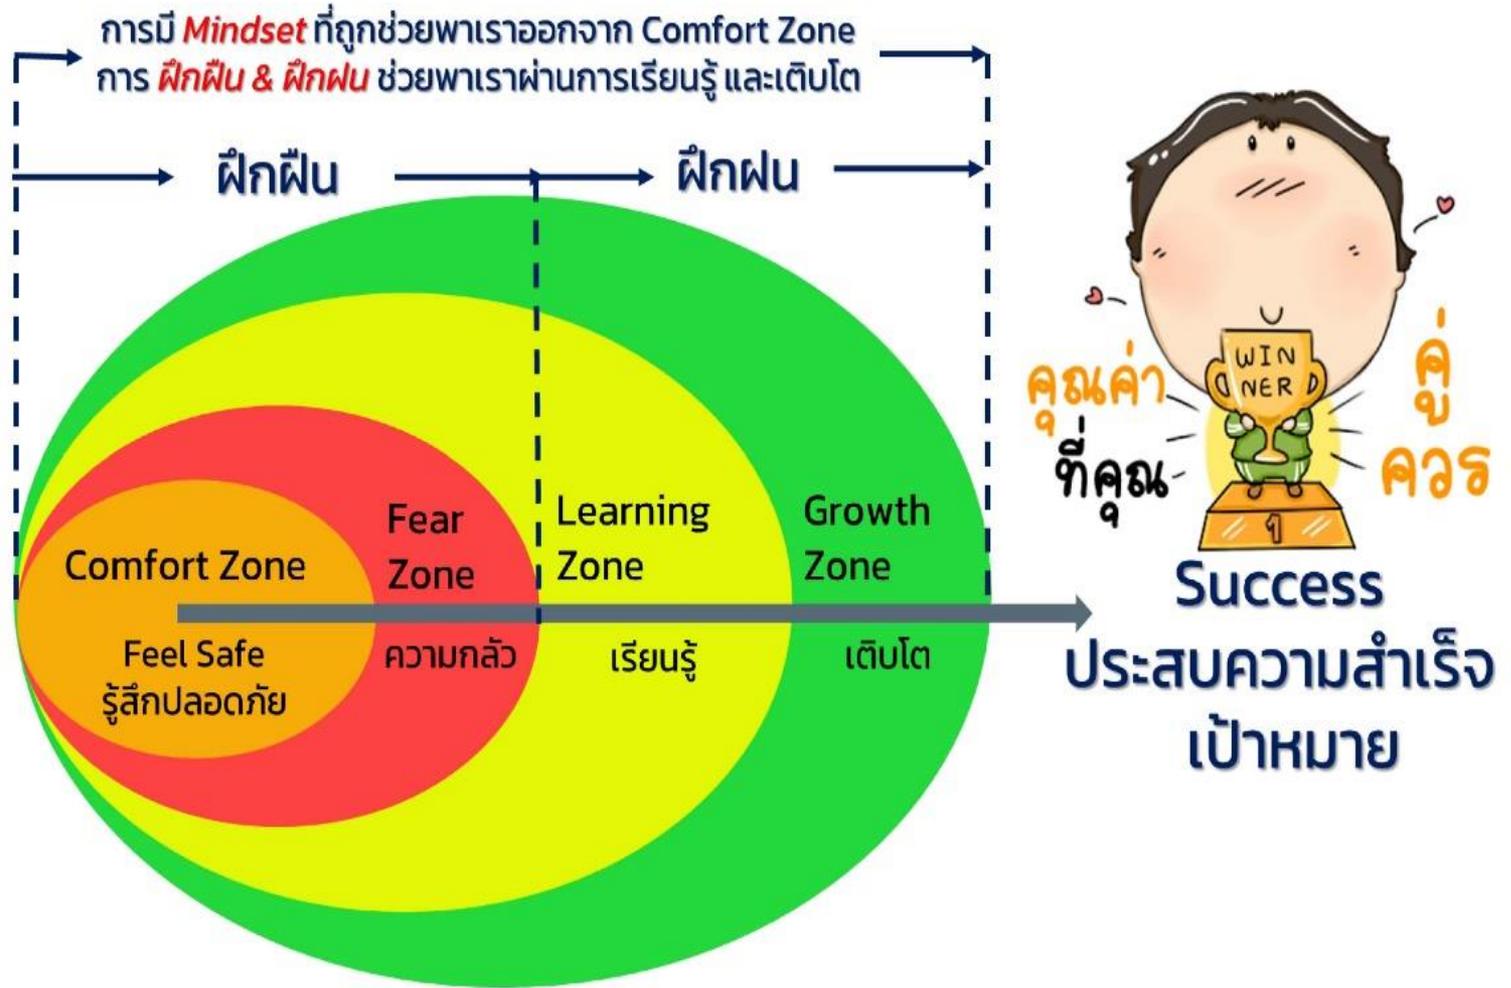

จะ รอ ... ความสำเร็จมาหา



หรือ เดิน ... หน้าเข้าหาเป้าหมาย

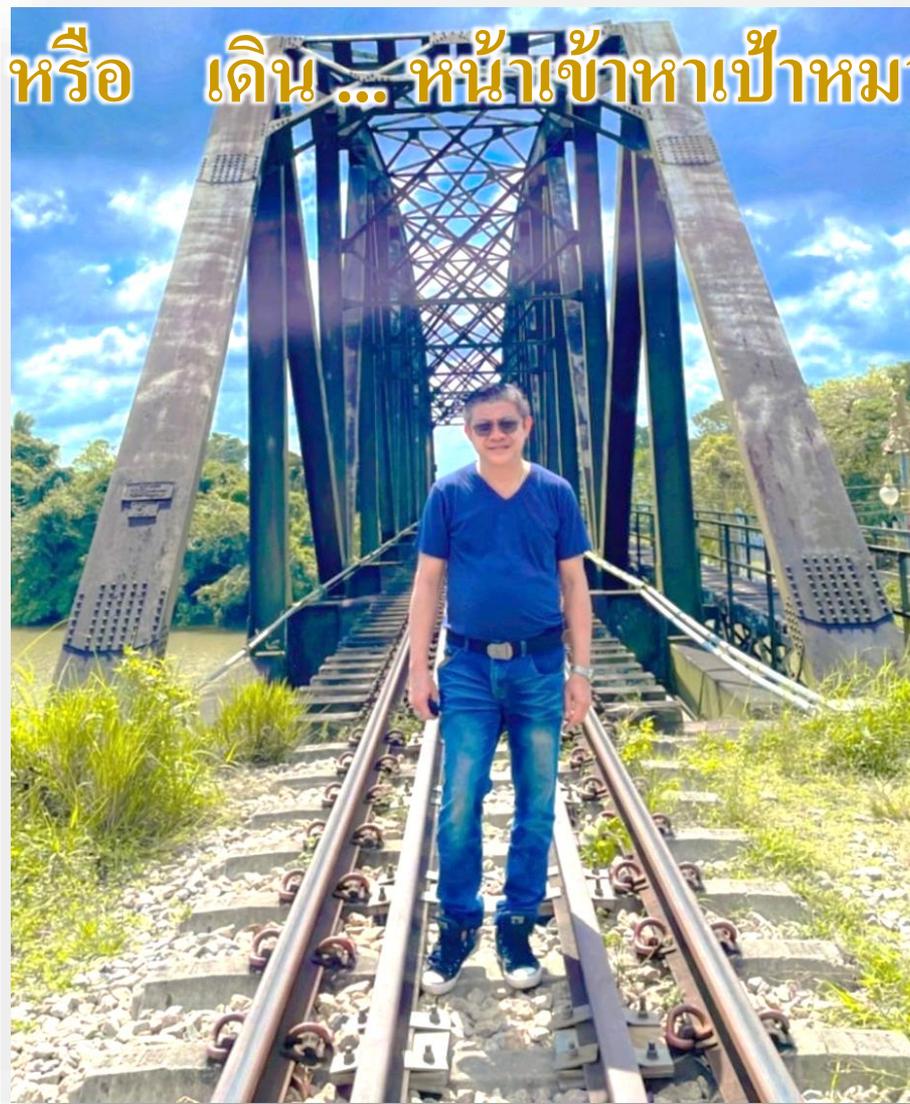




โครงการสงนนำและบำรุงรักษาปากพนงบน

ดำนกงานขลประทนนที่15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การจ้ดการควมรู้ (Knowledge Management) : KM

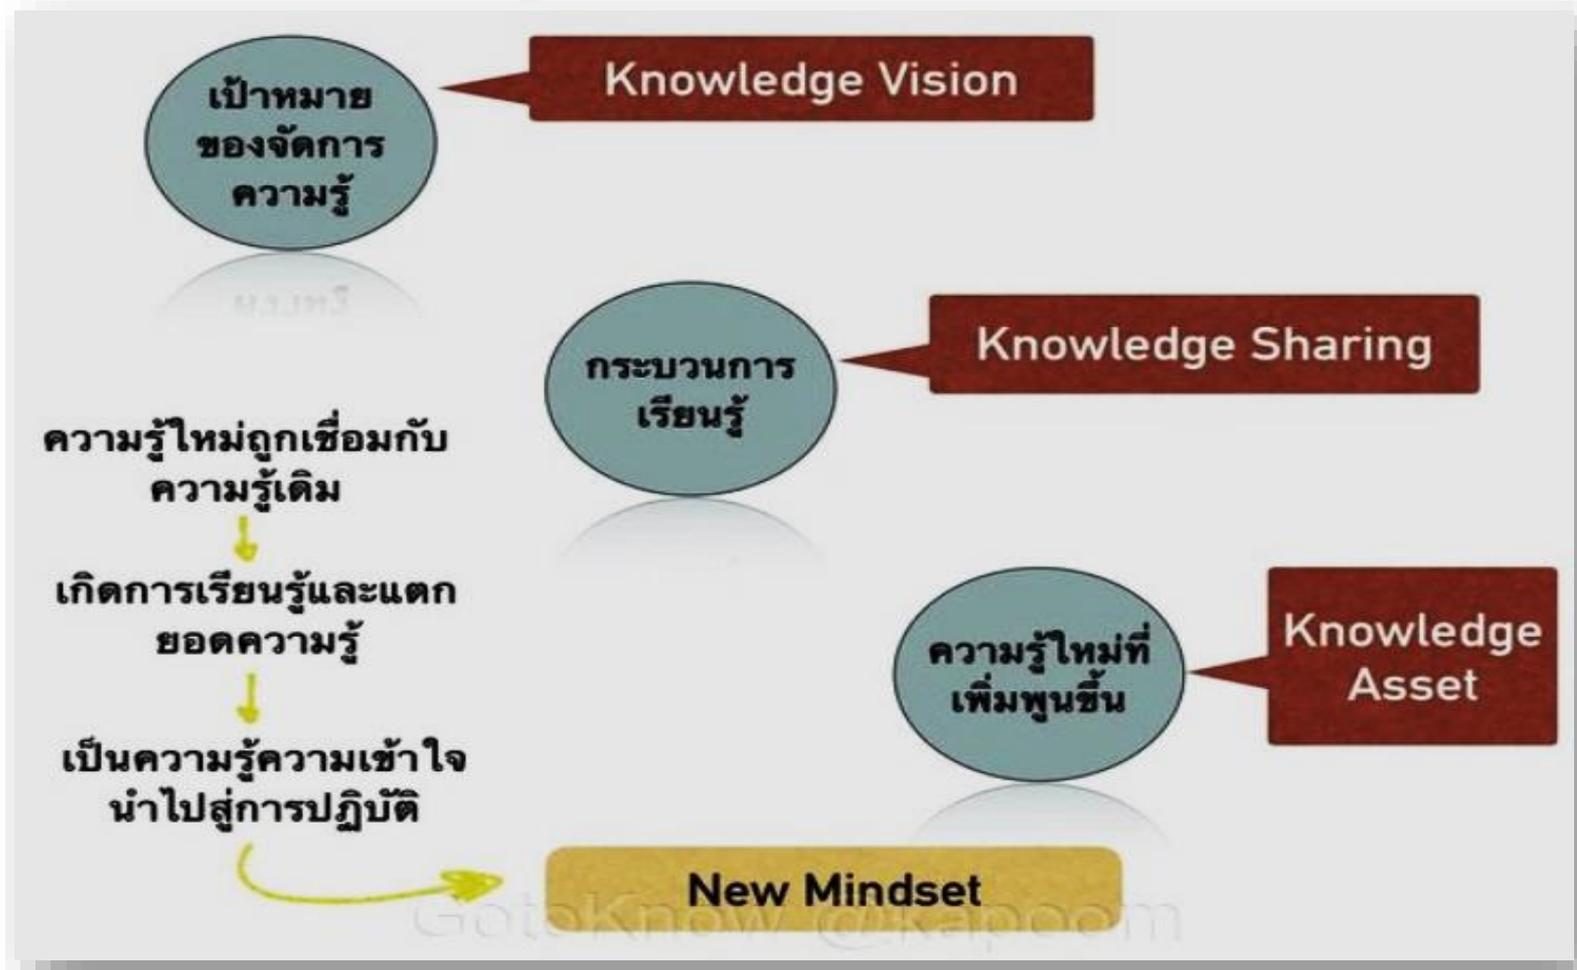

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization : LO)



CoPs ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Community of Practice



Share to Learn มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

1 สนใจเรื่องเดียวกัน



การรวมตัวของกลุ่มคน
ที่สนใจเรื่องเดียวกัน

4 ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

ใช้เวลาในการประชุมกัน
ไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง



2 ถ่ายโอนความรู้

เป็นเครื่องมือใช้สร้างและ
ถ่ายโอนความรู้ ในเรื่อง
ที่กลุ่มสนใจ



5 โครงสร้างสมาชิก



มีการกำหนดโครงสร้าง
ของสมาชิก เช่น ผู้นำCoPs
สมาชิก และเลขานุการ

3 พัฒนาและยกระดับ



มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและยกระดับ
ความสามารถของสมาชิก
ในกลุ่ม

6 จัดบันทึก

มีการจัดบันทึกการเรียนรู้
ทุกครั้ง



Infographic@KM



AAR

After Action Review บทวนผลการปฏิบัติงาน



Share to Learn มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

AAR ทำอย่างไร



1

ทำทันที

จัดให้มีการทำ AAR ทันที
เมื่อทำกิจกรรมแล้วเสร็จ

2

มีส่วนร่วม

ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น

3

Facilitator

ต้องมี Facilitator ทำหน้าที่
กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4


สร้างสรรค์

นำเสนอความคิดเห็น อย่างสร้างสรรค์
มุ่งเน้นการปรับปรุงการทำงาน

5

จดบันทึก

มีการจดบันทึกการเรียนรู้
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง



คุยอะไรกันใน AAR

1

ทำได้ดี

สิ่งที่ทำได้ดี และควรรักษาไว้
ให้มีต่อไป

2

ตั้งเป้าหมาย

เรามาดังเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตามแผนหรือไม่

3

ปัญหา อุปสรรค

อะไรเป็น ปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน



4

เรียนรู้

เราได้เรียนรู้อะไรจากการทำ
กิจกรรมนั้นๆ

5

ปรับปรุง

แนวทางการนำไปปรับปรุง
ครั้งต่อไป

6

ข้อพึงระวัง


ข้อพึงระวังที่ควรให้
ความสำคัญ



Infographic@KM

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพน้ำบน

ดำเนินงานเขตพื้นที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

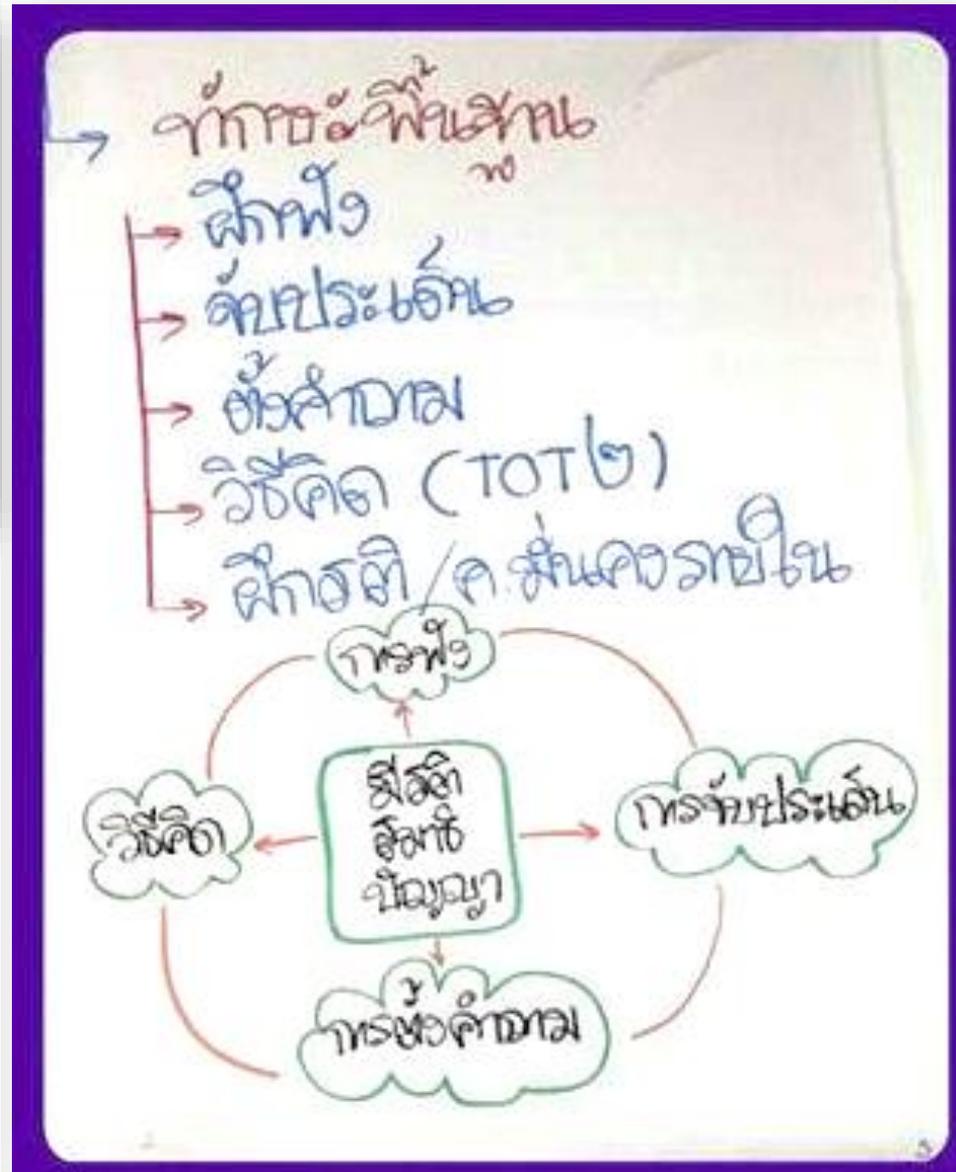

01

EMPATHIZE

เข้าใจ เข้าใจ
ทำความเข้าใจความต้องการ
ความจำเป็น อารมณ์ความรู้สึก
ปัญหา ความกังวล (Pain Point)
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเรียนรู้
ปัญหาที่แท้จริงของเขา ด้วย
วิธีการตาม การฟัง การสังเกต
หรือการร่วมประสบการณ์ ไปด้วย
เขา

Empathise (เอาใจใส่)


ทักษะของวิทยากรกระบวนการ facilitator

Community of Practice (CoPs)

การทบทวนผลการปฏิบัติงาน After Action Review (AAR)

ทักษะของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization : LO)





โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



1.2.3 สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญา ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และยังมีได้ส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งมอบงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ


กรณีที่มีค่าปรับ สัญญาที่ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 และครบกำหนดหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565

จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัญญาเลขที่ ปนบ/จ.02/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินงบประมาณตามสัญญา 19,500,000 บาท

อายุสัญญา 150 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 25 เมษายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะกรรมการฯตรวจรับงานวันที่ 6 มิถุนายน 2565

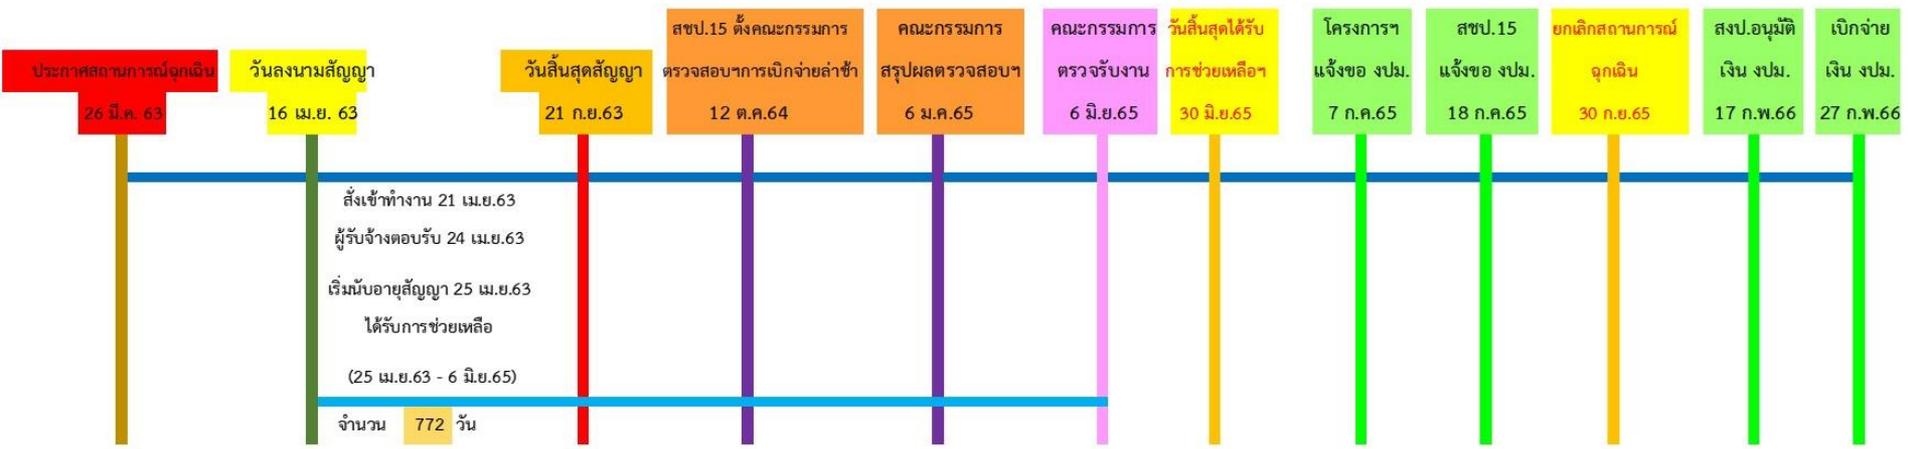



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การจัดการความรู้
knowledge management

ที่ กษ ๐๓๒๔.๑๑/๑๖๘

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๐๑๘๐

๕

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ปนบ./จ๐๒/๒๕๖๓/ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวาม จำนวน ๑ แห่ง ตำบลเขาพังไกร อำเภอทิวไร จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินตามสัญญา ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) กับกรมชลประทาน โดย สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญากำหนดเวลาแล้วเสร็จว่า "ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว" นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเห็นว่าสมควรเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาได้ จึงแจ้งให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา โดยจะเริ่มอายุสัญญาถัดจาก วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) [Signature] ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(นายประวิติ ชاکรานนท์)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการตรวจรับพัสดุ
(นายชนนที สอนลีลา)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการตรวจรับพัสดุ
(นายนิรทวัฒน์ เสนชู)

ฝ่ายวิศวกรรม

โทร ๐๗๕๓๕ ๔๒๕๔

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๒๕๔

E.mail rid๑๕_tonbun๑๖๑@hotmail.com

วิภาดา พันธ์ 11.11.11 (๑๐๖) ๒๑ ๒๖๖ ๖๖

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ



ใบตอบรับ EMS ในประเทศ

ป.133 ข.

กรุณากรอกชื่อที่อยู่ของผู้ฝากส่ง
ในช่องด้านหน้า รวมทั้งกรอก
ชื่อและที่อยู่ของผู้รับและอื่นๆ
ในช่องด้านหลัง

ชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากส่ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน
๙๓/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังม่วง อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐



นำซองผู้รับ ส่ง ปณ.ปลายทาง
 วันที่ 12.00น. 18.30น.
 20.30น.



EW 9452 3291 4 TH

รหัสไปรษณีย์

8 0 1 8 0

ชื่อผู้รับ <u>นางสาววิภาดา พันธ์</u> บริษัท/ห้างร้าน/หมู่บ้าน <u>วัดวังม่วง</u> บ้านเลขที่ <u>๑๕/๑๒๕</u> หมู่ <u>๗</u> ถนน/ซอย <u>ถนนชะอวด</u> ตำบล/แขวง <u>วังม่วง</u> อำเภอ/เขต <u>ชะอวด</u> จังหวัด <u>นครศรีธรรมราช</u> รหัสไปรษณีย์ <u>๘๐๑๐๐</u> ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ <u>พัทลุง</u> วันที่ <u>๒๗/๔/๖๓</u> เดือน <u>พฤษภาคม</u> พ.ศ. <u>๒๕๖๓</u>	๒๒๓-๔๐๖ ๒๒๓-๔๐๖ ๒๒๓-๔๐๖ ๒๒๓-๔๐๖
คำตอบรับของผู้รับ ได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ <u>๒๗</u> เดือน <u>พฤษภาคม</u> พ.ศ. <u>๖๓</u> เวลา <u>๑๑.๒๑</u> ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน <u>[Signature]</u> เขียนชื่อตัวบรรจง (.....) เกี่ยวพันกับผู้รับโดยเป็น <u>พ.อ.</u> <input checked="" type="checkbox"/> รับเอง ลงชื่อเจ้าหน้าที่นำจ่าย <u>[Signature]</u> ตำแหน่ง <u>เจ้าพนักงาน</u>	๓๒๕๑๔ ๓๒๕๑๔



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ที่ กษ ๐๒๒๘.๑๑/๑๐๘

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๐๕๘๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เรงเตือนให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา (1)

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด อนันต์เมย์

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ปบป./๑๐๒/๒๕๖๒/ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือแจ้งให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาที่ กษ.๐๒๒๘.๑๑/๑๐๘๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

ตามสัญญาที่อ้างถึง หัวหุ้นส่วนจำกัด อนันต์เมย์ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชาวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๓๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินตามสัญญา ๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) กับกรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ และกรมชลประทาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีหนังสือตามข้ออ้าง ๒ แจ้งให้ทำงาน เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ความละเอียดแจ้งแล้ว

บัดนี้ ทำงาน ยังไม่ได้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขอแจ้งให้ทราบว่า ภายหลังจากได้เริ่มนับจากวันที่ทำงาน ได้รับหนังสือตามข้ออ้างถึง ๒ เป็นระยะเวลา ๑๔ วันแล้ว กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาข้อ ๗ และข้อ ๑๗ หากทำงาน ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขสัญญา

จึงเร่งเตือนมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) พริดา ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายประวิติ ชาศรานนท์)

(ลงชื่อ) Zm n กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายชนนท์ สอนิลลา)

(ลงชื่อ) พริดา กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายอัทวัฒน์ เสนุข)

ฝ่ายวิศวกรรม

โทร ๐๗๕๓๘ ๕๒๕๘

โทรสาร ๐ ๗๕๓๘ ๒๒๖๘

E-mail rtds_k_tonburie๑๖๑@hotmail.com

พริดา
12 พ.ค. 63

พริดา
12 พ.ค. 63

EMS ในครอบรับ EMS ในประเทศ

เลขหมายพัสดุที่อยู่ผู้ส่งพัสดุ
ในชื่อสำนักงาน รมท.ชกรอก
ชื่อและที่อยู่ของผู้รับและอื่นๆ
ในชื่อสำนักงาน:

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน
๑๓/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังม่วง อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๕๘๐

รหัสไปรษณีย์ ๙ ๐ ๑ ๙ ๐

EW 9452 3325 1 TH

ผู้รับได้รับพัสดุเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งชื่อผู้รับพัสดุ
บริษัท/ห้างร้าน/หมู่บ้าน
บ้านเลขที่ ๙๒/123 หมู่ ๕ ถนนสุขุมวิท
ตำบล/แขวง/จังหวัด อำเภอ/เขต เขต/เมือง/กรุงเทพฯ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ๑๐๐๐๐๐
ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์
วันที่ เดือน พ.ศ.

ส่งพัสดุไปรษณีย์ที่
หมายเลข EMS
ตามข้อ ๕ ของ

33415

ค่าตอบรับของผู้รับ ได้รับรองตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พ.ค. ๖๓ เวลา 13.04 น.
ละชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน
เขียนชื่อตัวบรรจง ()
เกี่ยวกับผู้รับโดยเป็น พริดา รับเอง
ลงชื่อเจ้าหน้าที่นำจ่าย พริดา ตำแหน่ง พริดา

สาขาจังหวัด
สำนักงานที่ส่งพัสดุไปรษณีย์

ที่ กษ ๐๒๒๘.๑๑/๑๐๘

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๐๕๘๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เรงเตือนให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา (ครั้งที่ ๒)

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด อนันต์เมย์

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ปบป./๑๐๒/๒๕๖๒/ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือแจ้งให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาที่ กษ.๐๒๒๘.๑๑/๑๐๘๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

ตามสัญญาที่อ้างถึง หัวหุ้นส่วนจำกัด อนันต์เมย์ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชาวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๓๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินตามสัญญา ๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) กับกรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ กรมชลประทาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีหนังสือตามข้ออ้าง ๒ แจ้งให้ทำงาน เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ความละเอียดแจ้งแล้ว

บัดนี้ ทำงาน ยังไม่ได้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขอแจ้งให้ทราบว่า ภายหลังจากได้เริ่มนับถัดจากวันที่ทำงาน ได้รับหนังสือตามข้ออ้างถึง ๒ เป็นระยะเวลา ๒๖ วันแล้ว กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาข้อ ๗ และข้อ ๑๗ หากทำงาน ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขสัญญา

จึงเร่งเตือนมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) พริดา ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายประวิติ ชาศรานนท์)

(ลงชื่อ) พริดา กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายชนนท์ สอนิลลา)

(ลงชื่อ) พริดา กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายอัทวัฒน์ เสนุข)

ฝ่ายวิศวกรรม

โทร ๐๗๕๓๘ ๕๒๕๘

โทรสาร ๐ ๗๕๓๘ ๒๒๖๘

E-mail rtds_k_tonburie๑๖๑@hotmail.com

พริดา
12 พ.ค. 63

พริดา
12 พ.ค. 63

ผู้รับได้รับพัสดุเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งชื่อผู้รับพัสดุ
บริษัท/ห้างร้าน/หมู่บ้าน
บ้านเลขที่ ๙๒/123 หมู่ ๕ ถนนสุขุมวิท
ตำบล/แขวง/จังหวัด อำเภอ/เขต เขต/เมือง/กรุงเทพฯ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ๑๐๐๐๐๐
ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์
วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่งพัสดุไปรษณีย์ที่
หมายเลข EMS
ตามข้อ ๕ ของ

33591

ค่าตอบรับของผู้รับ ได้รับรองตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พ.ค. ๖๓ เวลา 11.๐๕ น.
ละชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน
เขียนชื่อตัวบรรจง ()
เกี่ยวกับผู้รับโดยเป็น พริดา รับเอง
ลงชื่อเจ้าหน้าที่นำจ่าย พริดา ตำแหน่ง พริดา

สาขาจังหวัด
สำนักงานที่ส่งพัสดุไปรษณีย์

EMS ในครอบรับ EMS ในประเทศ

เลขหมายพัสดุที่อยู่ผู้ส่งพัสดุ
ในชื่อสำนักงาน รมท.ชกรอก
ชื่อและที่อยู่ของผู้รับและอื่นๆ
ในชื่อสำนักงาน:

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน
๑๓/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังม่วง อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๕๘๐

รหัสไปรษณีย์ ๙ ๐ ๑ ๙ ๐

EW 9452 3332 2 TH



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 080 354900 1480

95/135 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 081-5977967 โทรสาร. 075-807563

ที่ 05/2563/006

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอแจ้งอนุมัติ แบบผลิต, ติดตั้งของเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ชนิดเพลาลัง อัตราการสูบน้ำ 0.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยอกหน้า 10 เมตร โครงการจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชานา จำนวน 1 แห่ง ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน
อ้างถึง สัญญาเลขที่ ปนบ./จ.02/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

- เอกสารที่แนบ
- 1.ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะสำหรับเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดเพลาลัง อัตราการสูบน้ำ 0.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยอกหน้า 10 เมตร
 - 2.แบบผลิตและติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ชนิดเพลาลัง อัตราการสูบน้ำ 0.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยอกหน้า 10 เมตร

ตามที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน กรมชลประทาน ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชานา จำนวน 1 แห่ง ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี มูลค่างานตามสัญญา 19,500,000.00 บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามสัญญาจ้างที่อ้างถึงนั้น

ทางห้างฯ เข้าตรวจเช็คสภาพหน้างานก่อสร้างสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ชนิดเพลาลัง อัตราการสูบน้ำ 0.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยอกหน้า 10 เมตร ณ โครงการจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชานา จำนวน 1 แห่ง ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีข้อจำกัดในการติดตั้งและขนส่งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ชนิดเพลาลัง อัตราการสูบน้ำ 0.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยอกหน้า 10 เมตร (ตามเอกสารแนบ) เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานราชการ ทางห้างฯ จึงใคร่ขอเสนอรายการอนุมัติแบบผลิต, ติดตั้งของเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ชนิดเพลาลัง อัตราการสูบน้ำ 0.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยอกหน้า 10 เมตร ดังต่อไปนี้

1. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะสำหรับเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดเพลาลัง อัตราการสูบน้ำ 0.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยอกหน้า 10 เมตร จำนวน 1 ชุด
2. แบบผลิตและติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ชนิดเพลาลัง อัตราการสูบน้ำ 0.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยอกหน้า 10 เมตร จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทางกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชา ตวงมณี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



BO-02-10

ที่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขบัตรประจำตัวประชาชน 0803549001480
บริษัท/ห้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี
ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร เลขที่ 95/135 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอก อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000

เรื่อง รับทราบและยืนยันเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- อ้างถึง
1. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ปนบ./จ.02/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
 2. หนังสือ ที่ กช 0324.11/144 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563
 3. หนังสือ ที่ กช 0324.11/190 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ตามสัญญาที่อ้างถึง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี ได้ทำสัญญารับจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชานา จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช กับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน สำนักงานชลประทานที่ 15 วงเงินค่าจ้างก่อสร้าง 19,500,000.00 บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีหนังสือแจ้งให้เข้าปฏิบัติงานตามหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี รับทราบการแจ้งเข้าปฏิบัติงาน และบริษัทจะเริ่มเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชา ตวงมณี)

ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ



โทรศัพท์.....	เอกสารประกอบการพิจารณา (สิ่งที่ส่งมาด้วย)	
โทรสาร.....	<input type="radio"/>	จำนวน.....แผ่น
e-mail Address	<input type="radio"/>	จำนวน.....แผ่น
.....	<input type="radio"/>	จำนวน.....แผ่น

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

รับส่ง ที่..... 596

วันที่..... ๙ มี.ย. ๒๕๖๓



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การจัดการความรู้
น้ำใสใจจริง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน
 รับส่งที่ ๔๗๐
 วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔
 หักหุ้นส่วนจำกัด อนันต์มี
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐80 354900 148๐
 เวลา 95/135 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซัด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 โทร 081-5977967 โทรสาร. 075-807563

ที่ 199/2564
 19 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขอแจ้งปัญหาอุปสรรคในปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
 เรียน ประธานกรรมการตรวจรับผล (ผ่านผู้ควบคุมงาน)
 อ้างถึง 1. สัญญาจ้าง เลขที่ ปนบ./จ02/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
 2. หนังสือหักหุ้นส่วนจำกัดอนันต์มี เลขที่ 38/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายอุปสรรคของอาคารบังคับน้ำที่ 4 จำนวน 1 ชุด

ตามสัญญาที่อ้างถึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ หักหุ้นส่วนจำกัด อนันต์มี เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชานา จำนวน 1 แห่ง ณ ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 19,500,000.- บาท (สิบเก้าล้านบาทแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 และหักหุ้นส่วนจำกัดอนันต์มี ได้มีหนังสือแจ้งไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ในส่วนของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำจุดที่ 4 เกิดความล่าช้า เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากหักหุ้นส่วนจำกัดอนันต์มี ไม่ได้ริบความร่วมมือจากประชาชนในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โดยประชาชนได้เข้ามาขัดขวางเพื่อไม่ให้บุคลากรของหักหุ้นส่วนจำกัดอนันต์มี เข้าไปดำเนินการในเขตพื้นที่การก่อสร้าง ของอาคารบังคับน้ำจุดที่ 4 ตามที่อ้างถึง 1 และ 2

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมามีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ได้แจ้งให้หักหุ้นส่วนจำกัดอนันต์มี ผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง โดยแจ้งที่ประชุมด้วยวาจาว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ได้แก้ไขปัญหาเรื่องชาวบ้านในพื้นที่แล้วนั้น หักหุ้นส่วนจำกัดอนันต์มีขอเรียนให้ทราบว่า ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวไม่ได้รับแก้ไขแต่อย่างใด ปรากฏตามภาพสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น หักหุ้นส่วนจำกัด อนันต์มี ขอแจ้งปัญหาอุปสรรคในปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างดังกล่าว โดยขอให้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยมีหนังสือแจ้งมายังหักหุ้นส่วนจำกัดอนันต์มี ว่าทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หักหุ้นส่วนจำกัดอนันต์มี เข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้ โดยให้ท่านเข้าพื้นที่ปกหนุดแนวเขตระบุพื้นที่ก่อสร้างและกำหนดแนวเขตก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ เมื่อท่านดำเนินการเข้าแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว หักหุ้นส่วนจำกัดอนันต์มี จะเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
 (นายเดชา ดวงมณี)
 หัวหน้าผู้จัดการ



ภาพถ่ายปรศ งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำจุดที่ 4 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชานา จำนวน 1 แห่ง ณ ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช



18 พ.ค. 2021 11:33:04 ก่อนเที่ยง
 ตำบลเขาพังไกร
 อำเภอหัวไทร
 นครศรีธรรมราช
 ระดับความสูง-11.0m
 ความเร็ว 0.0km/h
 หมายเลขดัชนี: 7



18 พ.ค. 2021 11:32:55 ก่อนเที่ยง
 ตำบลเขาพังไกร
 อำเภอหัวไทร
 นครศรีธรรมราช
 ระดับความสูง-11.0m
 ความเร็ว 0.0km/h
 หมายเลขดัชนี: 8

ภาพถ่ายปรศ งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำจุดที่ 4 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชานา จำนวน 1 แห่ง ณ ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช



18 พ.ค. 2021 11:32:45 ก่อนเที่ยง
 ตำบลเขาพังไกร
 อำเภอหัวไทร
 นครศรีธรรมราช
 ระดับความสูง-12.0m
 ความเร็ว 0.0km/h
 หมายเลขดัชนี: 5



18 พ.ค. 2021 11:32:30 ก่อนเที่ยง
 ตำบลเขาพังไกร
 อำเภอหัวไทร
 นครศรีธรรมราช
 ระดับความสูง-18.0m
 ความเร็ว 0.0km/h
 หมายเลขดัชนี: 4



ที่ กษ ๐๒๑๘.๑๑/๑๐

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๐๑๘๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งมอบงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ปนบ.๐๒/จ.๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี ได้ทำสัญญารับจ้างงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินตามสัญญา ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) กับกรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ กรมชลประทาน นั้น

โดยทางห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี ได้ส่งใบแจ้งหนี้ที่ A๔๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา ซึ่งอยู่หลายรายการดังนี้

๑. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า



ยังไม่ขุดเปิดคันดินน้ำบ่อก่อสร้าง

๒. อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๑



จับตุ๊กตรวจบานยังไม่ได้และยังไม่มีการบดอัด

- ๓ -

๓. อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๒



- ๔ -

๔. อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๔



ปรับสภาพพื้นที่ยังไม่เรียบร้อย



ยังไม่ติดตั้งเครื่องวั้น กรอบบาน บานและยังไม่ร้อยทำบขั้วตรงทั้ง ๒ ด้าน

- ๘ -

ขอให้อำเภอส่งเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกดำเนินการแก้ไขงานให้เป็นไปตามสัญญาโดยด่วน
โดยขอให้ประสานกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างในการแก้ไขงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(นายประวิติ ชاکรานนท์)
(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรับพัสดุ
(นายชนนท์ สอนลิลา)
(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรับพัสดุ
(นายนัทวัฒน์ เสนชู)



๕.อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๕



ติดตั้งบานแล้วแต่ยังไม่ติดเครื่องกว้านบานระบาย

ฝ่ายวิศวกรรม
โทร ๐๗๕๓๕ ๔๒๕๔
โทรสาร ๐ ๗๕๔๙ ๓๒๔๙
E.mail ridsa_tonbun๕๕๑@hotmail.com

ได้รับคืนแล้ว
 ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕

ดูบ/ร่าง
ดูบ/พิมพ์
...../ตรวจ

- ๕ -

- ๖ -

๖.อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๖



ยังไม่ติดตั้งเครื่องกว้านและบาน หลังพ่อยังไม่ลงหินคลุกและยังไม่รื้อท่อนบั้ง

- ๗ -

๗.อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๑๐



ยังไม่ติดตั้งเครื่องกว้านและยังไม่รื้อท่อนบั้งชั่วคราว

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านกรมการตรวจรับพัสดุ

ตามห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์มณี ส่งใบแจ้งหนี้โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนโรงเรียนชาวนาจำนวน ๑ แห่ง ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (สัญญาเลขที่ ปนบ.๐๒/จ.๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓) โดยทางฝ่ายผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์มณี ดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา ซึ่งยังอยู่หลายรายการดังต่อไปนี้

๑. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า



- ยังไม่ขุดเปิดดินกันน้ำบ่อก่อสร้าง

๒. อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๑



หินคลุกความหนายังไม่ได้และยังไม่มีกรบอัด

๓. อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๒



ปรับสภาพพื้นที่ยังไม่เรียบร้อย

๔.อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๔



๖.อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๖



๕.อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๕



๗.อาคารบังคับน้ำแห่งที่ ๑๐



ยังไม่ติดตั้งเครื่องวาง กรอบบาน บานและยังไม่รื้อท่ำนบชั่วคราวทั้ง ๒ ด้าน



ติดตั้งบานแล้วแต่ยังไม่ติดตั้งเครื่องวางบานระบาย

ยังไม่ติดตั้งเครื่องวางและบาน หลังข่อยยังไม่ลงหินคลุกและยังไม่รื้อท่ำนบชั่วคราว



ยังไม่ติดตั้งเครื่องวางและยังไม่รื้อท่ำนบชั่วคราว



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การจัดการความ
น้ำ

ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าขึ้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕.๐๐ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักให้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างส่วนหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างส่วนหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างส่วนหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไปครบจำนวนเงินค่าจ้างส่วนหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า ๙๗,๕๐๐ (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาขอให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักฐานแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่ยอมรับพอใจ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทำงานดังกล่าว ๆ ไว้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจาก วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งให้เริ่มงานและจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้เริ่มการทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเลิก營業ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยไม่มีข้อผูกมัด

ในกรณีที่บอกเลิกสัญญาแล้วผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

สำเนาถูกต้อง
(นางปุ่นจิรา รักช้อย)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกหรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักการปฏิบัติการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและสัญญาฉบับนี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานบางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความคิดและความประมาทแลเลอของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยมิได้รับความยินยอมในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ได้คิดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้อำนาจเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่โต้แย้งกับผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนที่มิใช่จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงผู้แทนในกรณีที่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยทันที โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออาจเป็นเหตุเพื่อขอยกเลิกสัญญาหรือถอนงานจากเหตุนี้

สำเนาถูกต้อง
(นางปุ่นจิรา รักช้อย)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ





โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๙,๕๐๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับ จ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานพิเศษนั้นๆ ใดๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

สำเนาถูกต้อง

(นางปุนจิรา รักชัยค)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ





โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



02



Define the Problem (กำหนดปัญหา)



ข่าว

www.rid.go.th Facebook: เรารักชลประทาน

กรมชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ 15

โทร. 0 7544 3150 โทรสาร 0 7544 3140

Website : <http://irrigation.rid.go.th/rid15/>

Facebook : สำนักงานชลประทานที่ 15

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ร่วมประชุมติดตามงานจ้างก่อสร้าง

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายประวิติ ชาครานนท์

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ร่วมประชุมติดตามงานจ้างก่อสร้าง

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ณ ห้องประชุมข้างห้องผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

DEFINE

ตั้งโจทย์ ระบุปัญหา

นำข้อมูลที่ได้อีกขั้นตอน Empathize มา
รวมกันเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดกรอง
ให้เหลือปัญหาที่แท้จริง เพื่อป้องกันหรือระบุ
ปัญหาอย่างชัดเจน

ค้นหา Pain Point ที่แท้จริง





โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์





โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์





โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์






โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



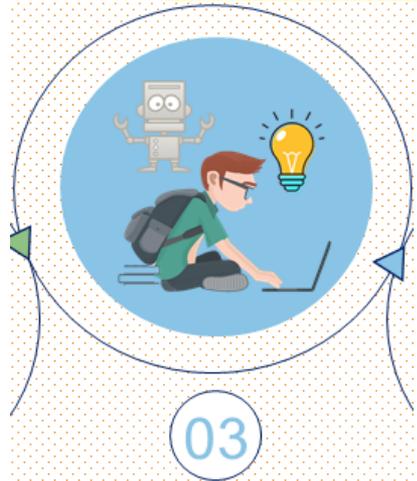


03


IDEATE

ระดมความคิด หาไอเดีย
การระดมความคิดแบบ "คิดนอกกรอบ"
จากหลากหลายมุมมอง หลากหลาย
วิธีการ โดยไม่มีการตัดสินถูกผิด ปลูก
ไอเดียสร้างสรรค์อย่างไม่ยึดจำกัด
เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหา **Pain Point** ที่
ระบุได้ในขั้น Define แล้วประมวลผล
คัดเลือกแนวความคิดตลอดจนแนว
ทางการแก้ไขปัญหาคัดรอบใจหยัง
ปัญหาใดครบถ้วนมากที่สุด

Ideate (ระดมแนวความคิด)

DESIGN THINKING

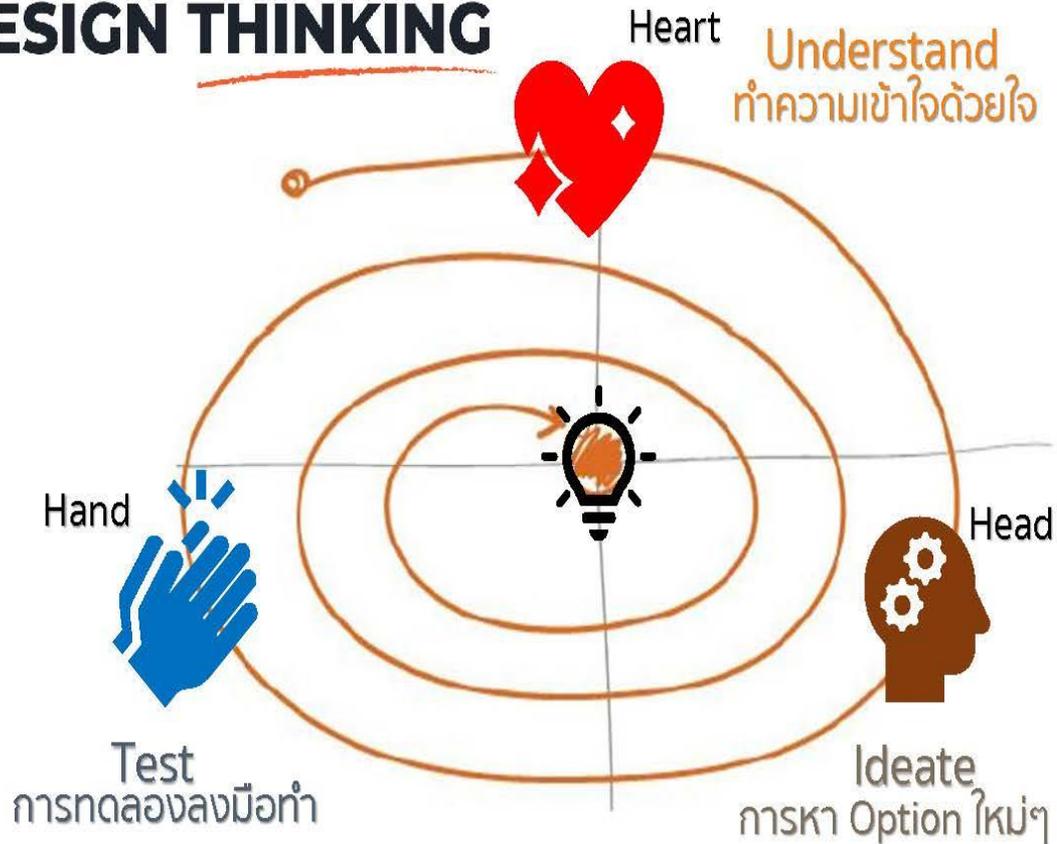

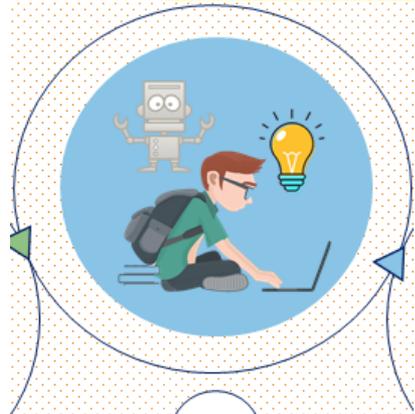

03

IDEATE

ระดมความคิด หาไอเดีย
การระดมความคิดแบบ "คิดนอกกรอบ"
จากหลากหลายมุมมอง หลากหลาย
วิธีการ โดยไม่มีการตัดสินถูกผิด ปลูก
ไอเดียสร้างสรรค์อย่างไม่มีขีดจำกัด
เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญห **Pain Point** ที่
ระบุได้ในขั้น Define แล้วประมวลผล
คัดเลือกแนวความคิดตลอดจนแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมโจทย์
ปัญหาได้ครบถ้วนมากที่สุด

Ideate (ระดมแนวความคิด)



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์






โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



04



PROTOTYPE

สร้างต้นแบบ
การสร้างผลิตภัณฑ์หรือแนวทางต้นแบบ
เพื่อทดสอบ ก่อนที่จะนำไปผลิตหรือใช้
งานจริง โดยลดขนาด ฟังก์ชัน หรือ
ลดทอนรายละเอียดลง เพื่อตรวจสอบวิธี
แก้ปัญหาที่คิดค้นไว้ในขั้นตอน Ideate

4. Prototype (ต้นแบบ)

Clear Purpose : ตั้งใจจะเน้นเรื่องอะไร



1

Skill

ทักษะ
ที่ใช้สร้างผลลัพธ์



2

Knowledge

ความรู้
สำหรับต่อยอด



3

Attitude

บางอย่างที่
เปลี่ยนทัศนคติ

ระยะที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการก่อสร้าง

เงื่อนไขสัญญาข้อ 7

- แผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง
- แผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ
- แผนบุคลากร

เงื่อนไขสัญญาข้อ 7

- การแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน

เงื่อนไขสัญญาข้อ 5

- ผู้รับจ้างขอเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า

1

ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวัน
ลงนาม

2

หลังได้รับแจ้ง
ให้เข้า
ปฏิบัติงาน

การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

- (1) การรายงานแผนความปลอดภัยในการก่อสร้าง
- (2) การอนุญาต/อนุมัติหนังสือรับรองให้ผู้รับจ้างนำไปใช้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
- (3) การจัดส่งครุภัณฑ์ตามสัญญา /การจัดส่งวัสดุเพื่อทดสอบ
- (4) การเสนอและพิจารณาครุภัณฑ์ตามสัญญา

(1) แผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง แผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ แผนบุคลากร

เงื่อนไขสัญญาข้อ 7

ครั้งที่ 1

ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอสิ่งเหล่านี้ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นชอบ ก่อนดำเนินการ

- (1) แผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง : จะต้องแสดงถึงขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องตามสภาพฤดูกาล และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
- (2) แผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ
- (3) แผนบุคลากร

ครั้งที่ 2

ภายหลังที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงานตามที่ได้เสนอไว้ โดยระบุวันที่ตามแผนงานจริง

แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง และแผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แล้วนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย



(2) การแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน

(1) เงื่อนไขสัญญาข้อ 7 (ก) วรรคสอง


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด..... (.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้

(2) การนับอายุสัญญา


จะเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

ผู้รับจ้างได้รับหนังสือการแจ้งให้เริ่มทำงานวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และมีหนังสือยืนยันการเข้าปฏิบัติงาน โดยระบุข้อความว่า “บริษัท ก. จำกัด รับทราบการแจ้งเข้าปฏิบัติงาน และบริษัทจะเริ่มเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป”

ให้เริ่มนับอายุสัญญา
วันที่ 2 มิถุนายน 2562

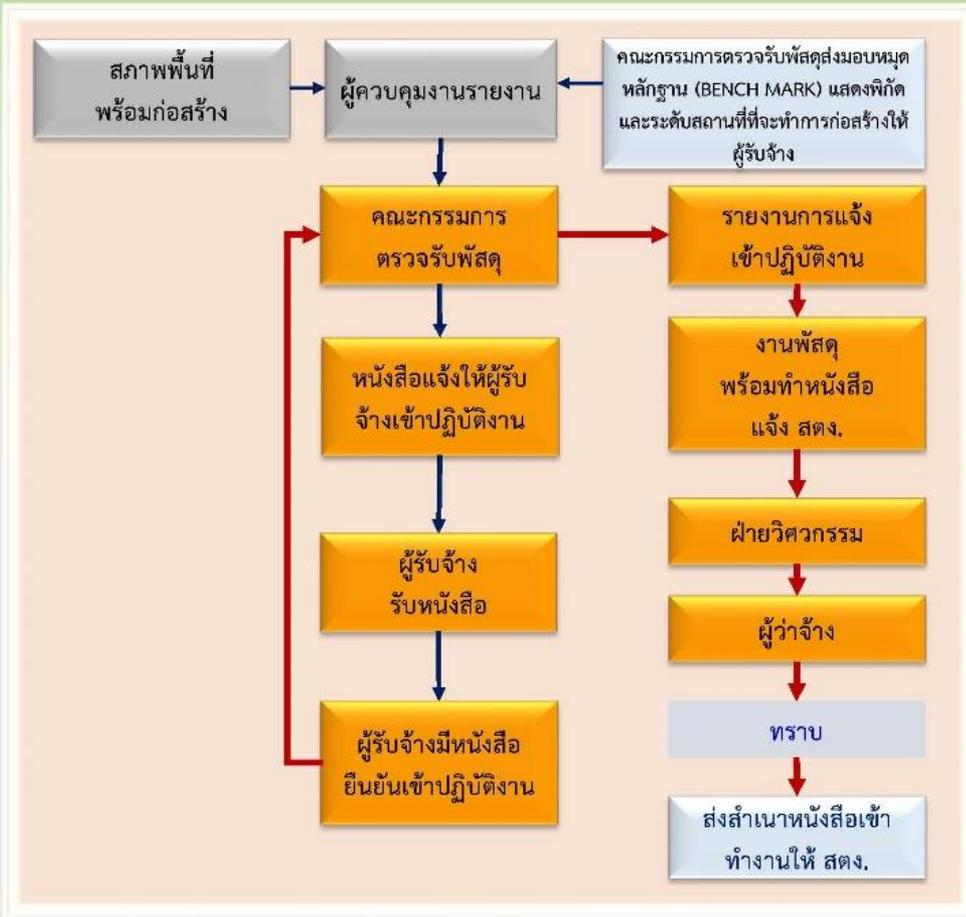

ระยะที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างก่อสร้าง

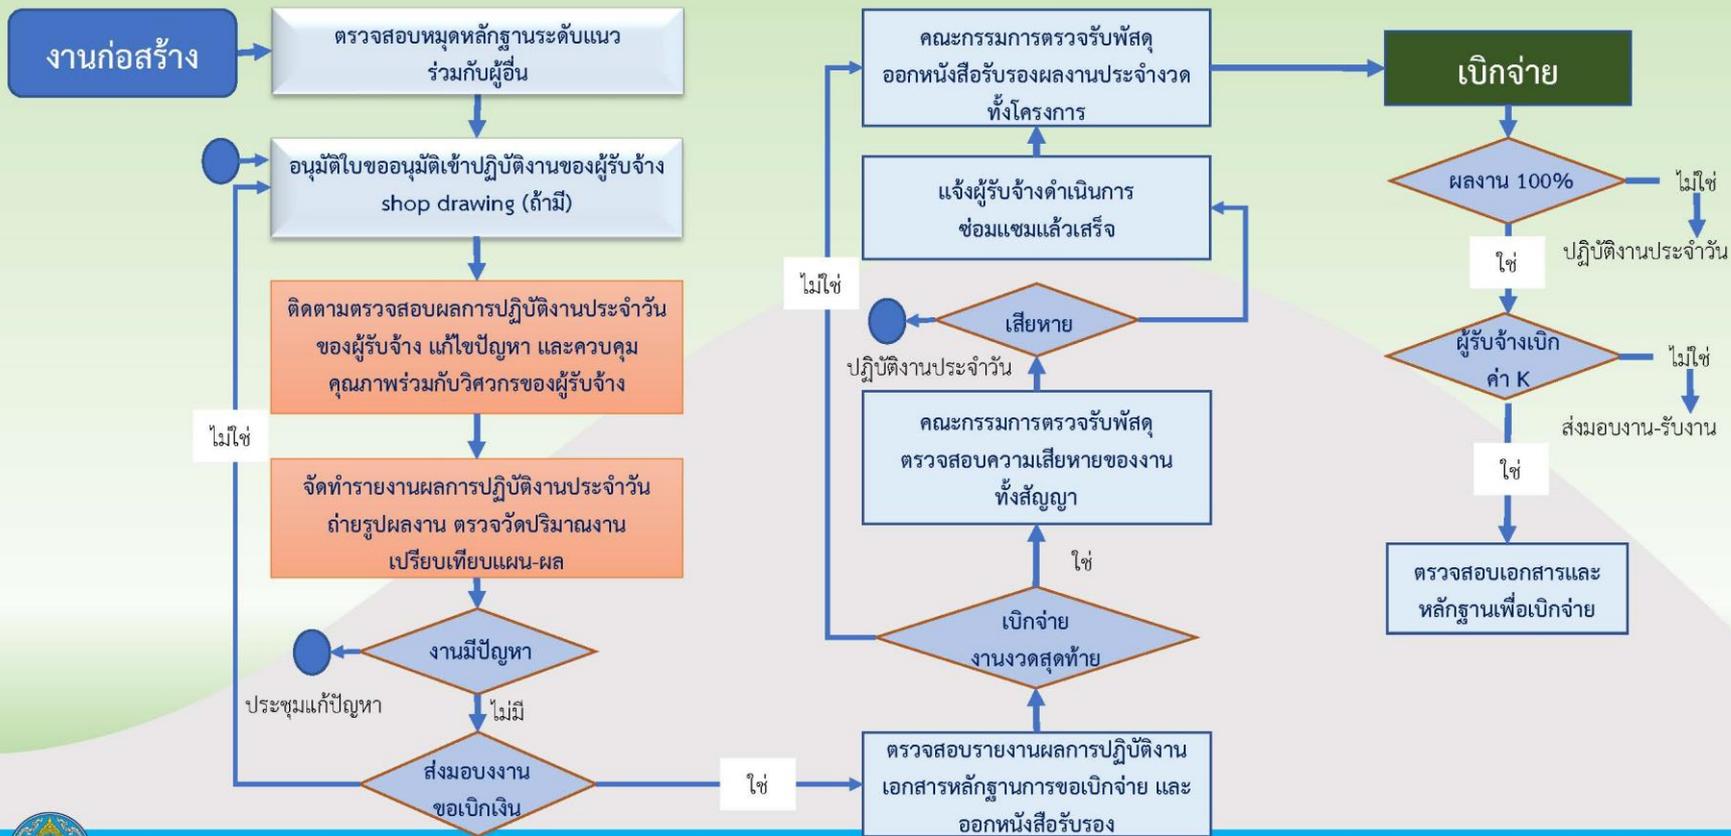

ระยะที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างการก่อสร้าง

- (1) รายงานประจำวัน และประจำสัปดาห์
- (2) รายงานความก้าวหน้าของสัญญา
- (3) การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน (เฉพาะงวด)
- (4) การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน (งวดสุดท้าย)
- (5) การส่งมอบและตรวจรับมอบงานทั้งสัญญา
- (6) การดำเนินการอื่นๆ เช่น การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน

(2) รายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง

การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้ **ผู้ควบคุมงาน** ของผู้ว่าจ้างทราบเป็น **ระยะทุกๆ 30 (สามสิบ) วัน** ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดให้หากปรากฏว่าการทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้เดิม



ผู้รับจ้างรายงานประจำงวด (ทุก 30 วัน)

รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (กบ.1)

รายงานแสดงเครื่องจักร-เครื่องมือประจำงวด (กบ.5)

แผน-ผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง

แผน-ผลการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ

แผน-ผลบุคลากร

(2) รายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ระเบียบข้อ 176 (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป



(3) การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน (เฉพาะงวด)

เมื่อผู้รับจ้างมีความประสงค์ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ เพื่อเบิกเงินค่างานผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำหนังสือขอส่งมอบงาน ซึ่งประกอบด้วยใบส่งมอบงานที่แสดงปริมาณงานแต่ละรายการและใบแจ้งหนี้ให้แก่หน่วยงานพัสดุ และเมื่อหน่วยงานพัสดุได้รับเอกสารดังกล่าวแล้วให้ตรวจสอบและลงทะเบียนควบคุมและแจ้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อดำเนินการตรวจรับงาน



(4) การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน (งวดสุดท้าย)

การส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดสุดท้าย หมายถึง ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานในส่วนที่เหลือเพื่อเบิกจ่ายเงินเป็นงวดสุดท้าย ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องทำการตรวจสอบผลงานตั้งแต่งวดแรกถึงงวดสุดท้ายว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการรายละเอียดตามสัญญาแล้ว หากงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ถูกต้อง มีการชำรุดเสียหาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องส่งเรื่องการขอส่งมอบงานคืนพร้อมมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการรายละเอียดเสียก่อนจึงจะทำการตรวจรับงานงวดสุดท้าย และในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องนั้นถือว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงาน

- 1**
- ใบแจ้งหนี้
 - ใบส่งมอบงาน
 - รายละเอียดการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

งานพัสดุ

- 2**
- ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน ทั้งสัญญา(พต.42)
 - รายงานการตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) พต.39

แจ้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงานรายงานการตรวจสอบผลงาน

ดำเนินการตรวจรับงาน

- 3**
- พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- เอกสารตาม (1) และ (2)
 - รายงานความก้าวหน้าและส่งมอบงานทุกงวด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงานการตรวจการจ้าง

หน่วยงานการเงินเบิกจ่าย

งานพัสดุ

เก็บรักษาเพื่อประกอบกรตรวจสอบ

ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้ว่าจ้างรับทราบ

(4) การส่งมอบงานและการตรวจรับงานทั้งสัญญา

การส่งมอบและตรวจรับมอบงานทั้งสัญญา ผู้รับจ้างต้องทำรายการรายละเอียดปริมาณงานทั้งสัญญา คือ **รายการรายละเอียดที่รวมผลงานทั้งหมดที่ได้ส่งมอบตั้งแต่งวดแรกถึงงวดสุดท้าย** เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจงานแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้ออกหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งสัญญา และดำเนินการรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเช่นเดียวกับการรายงานการส่งมอบงานเฉพาะงวด




ระยะที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีปัญหาระหว่างการก่อสร้าง



ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา


- ไม่เสนอแผนงาน หรือ
- ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือ
- จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือ
- ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือ
- ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ
- เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน

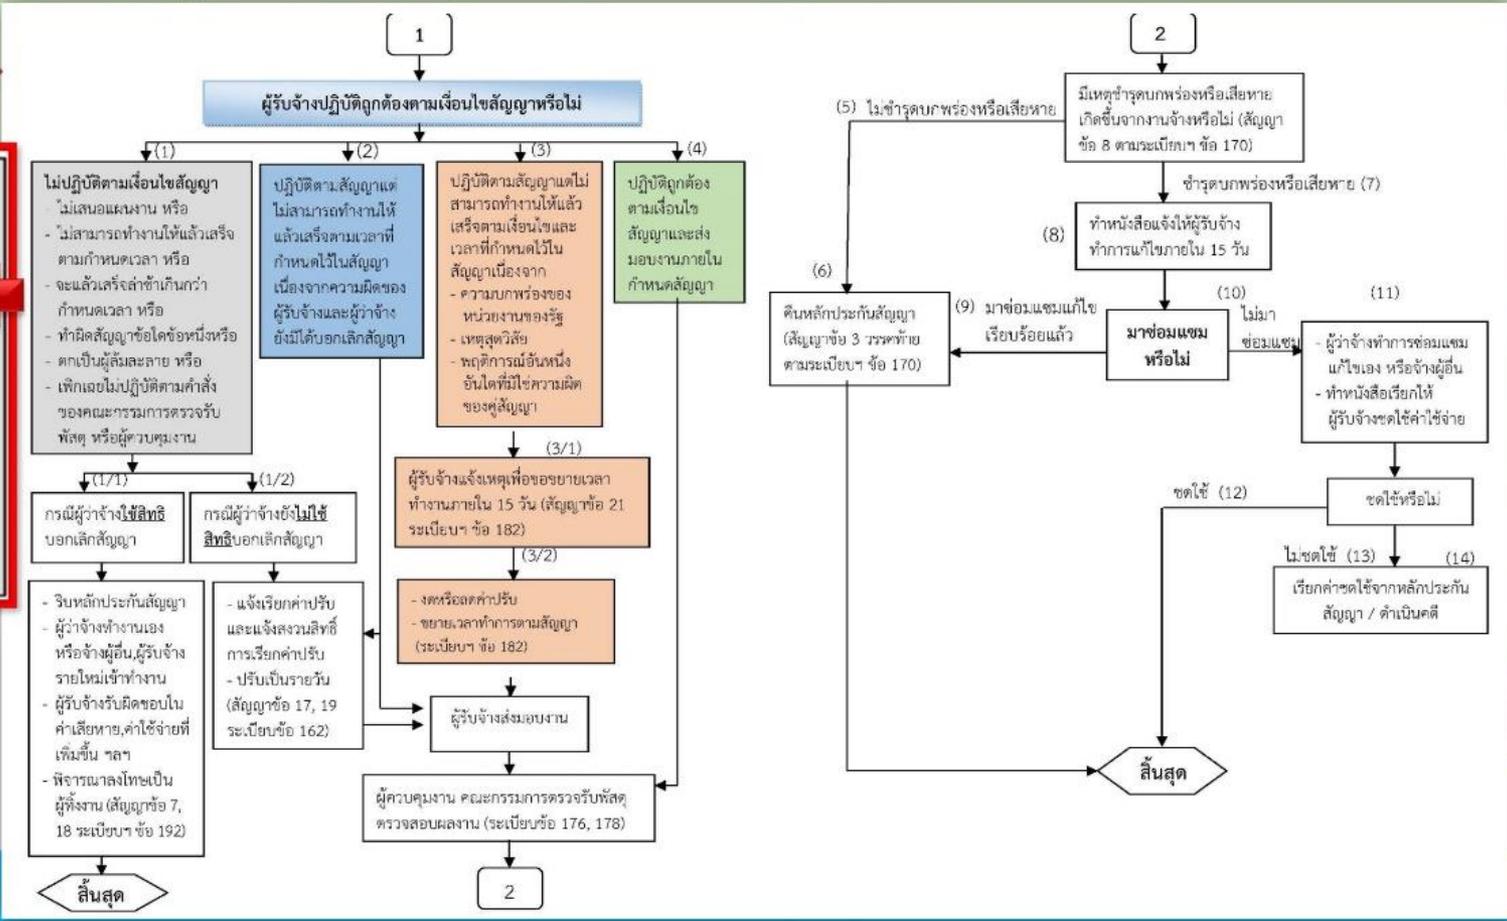

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ☒ ขอให้ยืนยันการเร่งรัดดำเนินงานตามแผนการก่อสร้าง
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 1
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 2
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 3
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 4
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 5
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 6
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 7
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 8
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 9
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 10
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 11
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 12
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 13
- ☒ เร่งรัดปฏิบัติงานตามสัญญา ครั้งที่ 14

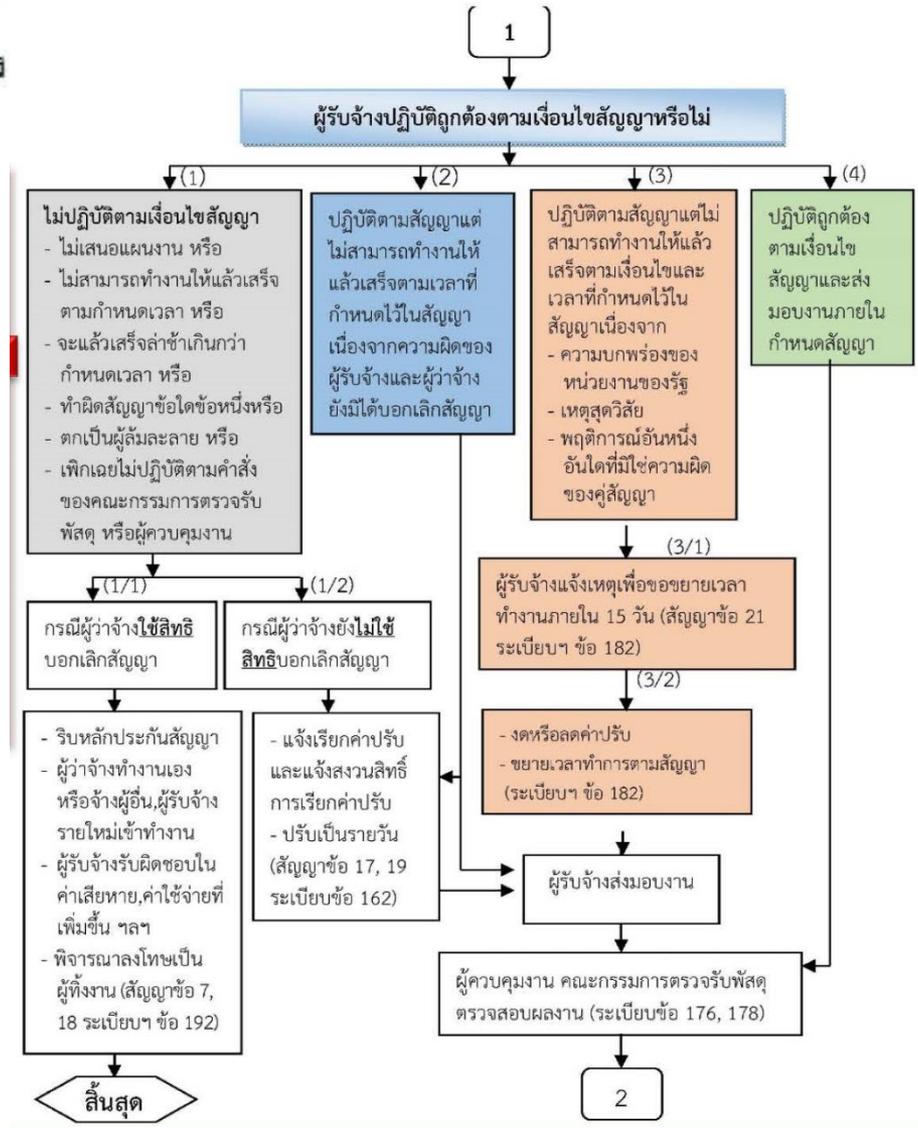



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การจัดการความรู้อินเทอร์เน็ต

สรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วงแพร่ระบาดโรคโควิด-19
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวาง) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 + ว 645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565)

สัญญา	ข้อ	ระยะเวลาสัญญา	การส่งมอบงาน (งวดเดียว หรืองวดสุดท้าย)	การตรวจรับ	ค่าปรับ	มาตรการให้ความช่วยเหลือ (ว 639 + ว 645)
ลงนามก่อน 26 มี.ค. 63 (วันประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน)	1.1.1				มีค่าปรับเกิดขึ้น แต่ไม่เข้าเงื่อนไขขงตหรือลดค่าปรับ	หากค่าปรับมีมูลค่าเกิน 25% ของวงเงินค่าจ้าง/พัสดุ ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 63 ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ
	1.1.2		ส่งมอบงานก่อนวันยกเลิกประกาศฯ อุทกภัย	ยังไม่ตรวจรับงาน/พัสดุ	มีค่าปรับเกิดก่อน 26 มี.ค.63 และไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 1.1.1	ให้คิดค่าปรับ 0% ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.65 ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับอัตราปกติ
	1.1.3		ส่งมอบงานหลังวันยกเลิกประกาศฯ อุทกภัย		มีค่าปรับเกิดก่อน 26 มี.ค.63 และไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 1.1.1	ให้คิดค่าปรับ 0% ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.65 ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับอัตราปกติ
	1.1.4	สัญญาครบในช่วงประกาศฯ อุทกภัย	ส่งมอบงานก่อนวันยกเลิกประกาศฯ อุทกภัย	ยังไม่ตรวจรับงาน/พัสดุ	มีค่าปรับเกิดขึ้น	ให้คิดค่าปรับ 0% ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญา จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65
	1.1.5	สัญญาครบในช่วงประกาศฯ อุทกภัย	ส่งมอบงานหลังวันยกเลิกประกาศฯ อุทกภัย		มีค่าปรับเกิดขึ้น	ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วคิดค่าปรับ 0% เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ 26 มี.ค.63 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับอัตราปกติ
	1.1.6	สัญญาครบภายหลังก่อนวันยกเลิกประกาศฯ อุทกภัย	ยังไม่ได้ส่งมอบงาน		มีค่าปรับเกิดขึ้น	ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วคิดค่าปรับ 0% เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ 26 มี.ค.63 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับอัตราปกติ
ลงนามหลัง 26 มี.ค. 63 (วันประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน) (ตั้งแต่ 26 มี.ค.63 ถึง 30 มิ.ย. 65)	1.2.1	สัญญาครบในช่วงประกาศฯ อุทกภัย	ส่งมอบงานก่อนวันยกเลิกประกาศฯ อุทกภัย	ยังไม่ตรวจรับงาน/พัสดุ	มีค่าปรับเกิดขึ้น	ให้คิดค่าปรับ 0% เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับอัตราปกติ
	1.2.2	สัญญาครบในช่วงประกาศฯ อุทกภัย	ส่งมอบงานหลังวันยกเลิกประกาศฯ อุทกภัย	ยังไม่ตรวจรับงาน/พัสดุ	มีค่าปรับเกิดขึ้น	ให้คิดค่าปรับ 0% เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับอัตราปกติ
	1.2.3	สัญญาครบภายหลังก่อนวันยกเลิกประกาศฯ อุทกภัย	ยังไม่ได้ส่งมอบงาน		มีค่าปรับเกิดขึ้น	ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาแล้วคิดค่าปรับ 0% เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับอัตราปกติ
ลงนามสัญญา หลัง 30 มิ.ย. 65 (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป)	1.3					ไม่ได้รับการช่วยเหลือ

หมายเหตุ

- กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณาหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 102 แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวหักออกจากจำนวนวันตามมาตรานี้ และจำนวนวันที่เหลือ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
- สำหรับค่าปรับส่วนที่เกินจำนวนวันตามมาตรานี้ ให้คิดในอัตราที่กำหนดในสัญญา ตามปกติ โดยให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 183 ต่อไป

ส่วนสัญญาพัสดุ กองพัสดุ



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การจัดการความรู้
knowledge management

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ ปนบ./จ.๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ระหว่าง

กรมชลประทาน กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์มณี

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ โครงการน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลวังอ่าง อำเภอปากพยับ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมชลประทาน โดย นายประวีต ชาติรานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งกรมที่ ข ๙๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์มณี ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ทะเบียนเลขที่ ๐๘๐๓๕๔๙๐๑๑๔๘๐ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๕/๑๓๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าซึก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๕๖๓๒๖๖๗ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๐๓๕๔๙๐๑๑๔๘๐ โดย นายสุทธิพร สารมาศ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นศ.๐๐๓๕๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามสัญญาเลขที่ ปนบ./จ.๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ กรมชลประทานว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์มณี ทำงานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชาวาน จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเลขที่ ปนบ./จ.๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ จึงได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มเติมข้อความในเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๑๗. ค่าปรับ วรรคสาม ดังนี้

"คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) พิจารณาแล้ว กรณีสัญญาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำวันที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวมาพิจารณาปรับกับผู้รับจ้างต่อไป และให้หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำวันที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้"

สำเนาถูกต้อง

(นางปุนจิรา รักชัยยศ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นางปุนจิรา รักชัยยศ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ข้อ ๒ ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมแทน ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและผู้สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายประวีต ชาติรานนท์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายสุทธิพร สารมาศ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางปุนจิรา รักชัยยศ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวมุกดา สังข์ทอง)



ด่วนที่สุด

ที่ กค (ทว) ๐๔๐๕๒/ว ๖๕๕



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ ทพ. ๑๐๔๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (ทว) ๐๔๐๕๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการ เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการ กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้มีหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (ทว) ๐๔๐๕๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเลิกการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กรณีการกำหนดอัตราค่าปรับตามสัญญา โดยให้แก่สัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือในส่วนของการกำหนดเงื่อนไขอัตราค่าปรับให้เป็นอัตราร้อยละ ๐ กรณีสัญญา ที่ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วแต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือตามมาตราการฯ กำหนดให้ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญา ในส่วนของเงื่อนไขอัตราค่าปรับให้เป็นอัตราร้อยละ ๐ จนถึงก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ได้ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไปถึงคราวที่ ๑๘ โดยขยายออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุม ศบค. รับทราบรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่า ภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยใหม่และผู้เสียชีวิตที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่อง และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้าสู่ระยะ Declining แล้ว การที่ ศบค. ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไป มิได้มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

๑. แก้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (ทว) ๐๔๐๕๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

/๑.๑. ...

- ๒ -

๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม "จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ" เป็น "ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕"

๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๓ จากเดิม "สัญญา ที่ได้ลงนามภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว" เป็น "สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว"

๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับความช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (ทว) ๐๔๐๕๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้ว ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลาตามข้อ ๑.๑ เพื่อแก้ไขสัญญา ให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับการช่วยเหลือ และให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนฉบับนี้ต่อไป

๒. สำหรับสัญญา ที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (ทว) ๐๔๐๕๒/ว ๕๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กฤษฏา พันธ์พิทักษ์

(นางสาวกฤษฏา ตันติเตมิต)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๔

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๘ - ๖



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การจัดการความรู้
Knowledge Management

หน้า ๔๗
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศ

เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีการขยายระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรทั้งหมด ๑๙ ครั้ง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้มาตรการต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เข้าดำเนินการควบคุม ระงับยับยั้ง ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) นั้น

โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ในภาพรวมของโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญและมีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ สอดคล้องกับภาพรวมของสถานการณ์ในประเทศไทยสืบเนื่องมาจากการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่เกิดการระบาด ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่จำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเป็นไปโดยบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ทำให้สามารถผ่อนคลายนโยบายใช้บรรดามาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อทั้งประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินชีวิต ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมทั้งหลายให้เข้าสู่ภาวะปกติ สถานการณ์อันเป็นเหตุของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจึงได้คลี่คลายลงอย่างมาก โดยหน่วยงานของรัฐทั้งฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคงสามารถนำมาตรการตามกฎหมายเข้าแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรดังกล่าว

ในส่วนของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป

หน้า ๔๘
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

- ข้อ ๒ ให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง ดังต่อไปนี้ เป็นอันสิ้นสุดลง
- (๑) ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง อันเนื่องมาจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตามข้อ ๑
 - (๒) ประกาศและคำสั่งที่ออกตามกฎหมายเฉพาะซึ่งให้ถือว่าเป็นประกาศหรือสั่งตามข้อกำหนดอันเนื่องมาจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตามข้อ ๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน
นายกรัฐมนตรี



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับฝน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ประกาศกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอหัวไทร

ด้วยเกิดสถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ก่อยังไม่สิ้นสุด สถานที่เกิดขึ้น พื้นที่หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลควนชะลิก หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลเขาพังไกร หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลแหลม หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลรวมแก้ว หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลเกาะเพชร หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลบางบน หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลบ้านราม หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลท่าซอม หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลหน้าสน หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลทรายขาว และหมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๔๓,๒๓๗ คน ๑๗,๕๗๒ ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย พืชผัก ๔๐,๓๕๑ ไร่ นา ๓๒,๔๒๒ ไร่ ปอปลา ๒๕,๐๐๐ ไร่ ปอปูล ๗๐๐ ไร่ บ่อเลี้ยง ๒,๕๐๐ ไร่ โค/กระบือ ๑๘,๐๐๐ ตัว สุกร ๓,๒๐๐ ตัว เป็ด ๒๐,๐๐๐ ตัว ไก่ ๒๐,๐๐๐ ตัว สัตว์อื่นๆ และ ภาชนะ ๔,๒๕๘ ตัว สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนนเสียหาย ๑๑๐ สาย คอสะพาน ๑ แห่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อการสาธารณสุข และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของผู้อื่นในสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัย ให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) หรือฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องออกจกกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง สิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีอุทกภัย (อำเภอหัวไทร)

ตามที่จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัย กรณีเกิดเหตุ อุทกภัย เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ได้ไ้เกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซียแนวโน้มจะเคลื่อนตัวทางตะวันตกผ่านประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ภาคใต้ และวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมาบางแห่งตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ทะเลมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ทำให้เกิดเหตุอุทกภัย และภัยพิบัติกรณีอุทกภัยดังกล่าวยังไม่ยุติ นับ

ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัย (อำเภอหัวไทร) ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลควนชะลิก หมู่ที่ ๑๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพังไกร หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแหลม หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลรวมแก้ว หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ และหมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะเพชร หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ และหมู่ที่ ๔ ตำบลบางบน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านราม หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ และหมู่ที่ ๔ ตำบลท่าซอม หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ และหมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าสน หมู่ที่ ๑๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดภัยเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.


บัดนี้ สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีอุทกภัยดังกล่าว ได้ยุติลงแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช


4. TEST (การทดสอบ)

งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที
 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี
 สัญญาเลขที่ ปนบ.จ.02/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
 วงเงิน 19,500,000 บาท อายุสัญญา 150 วัน

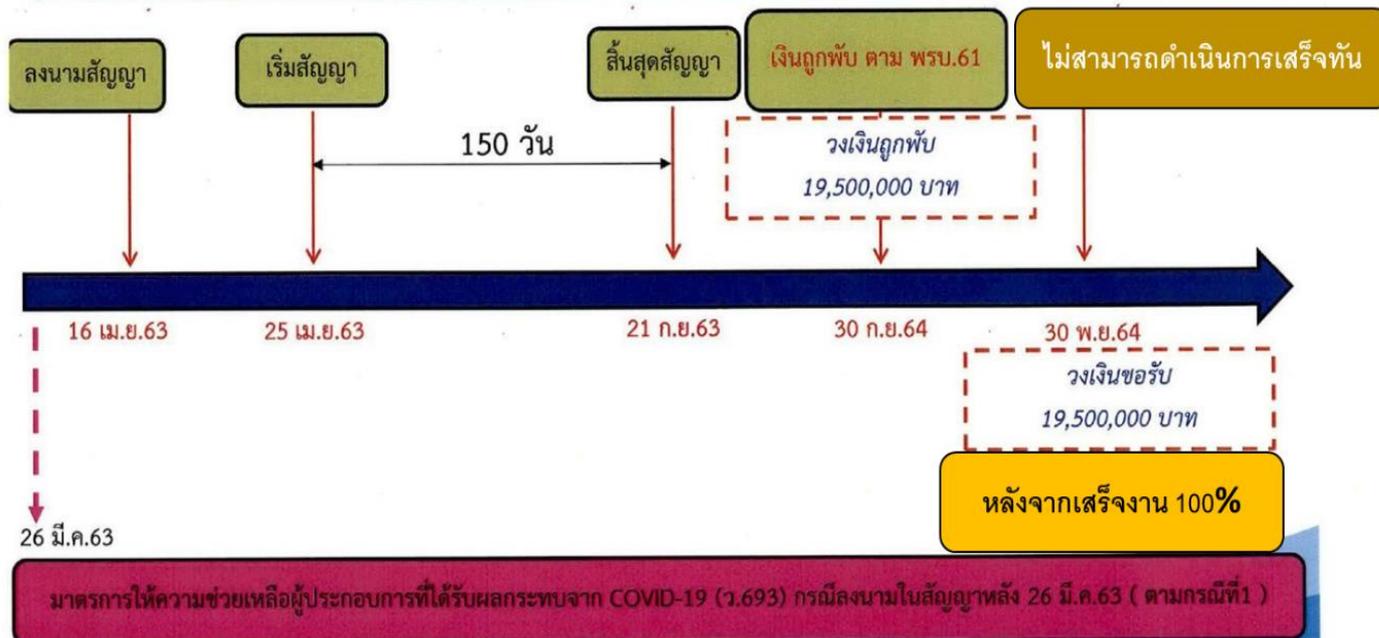

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

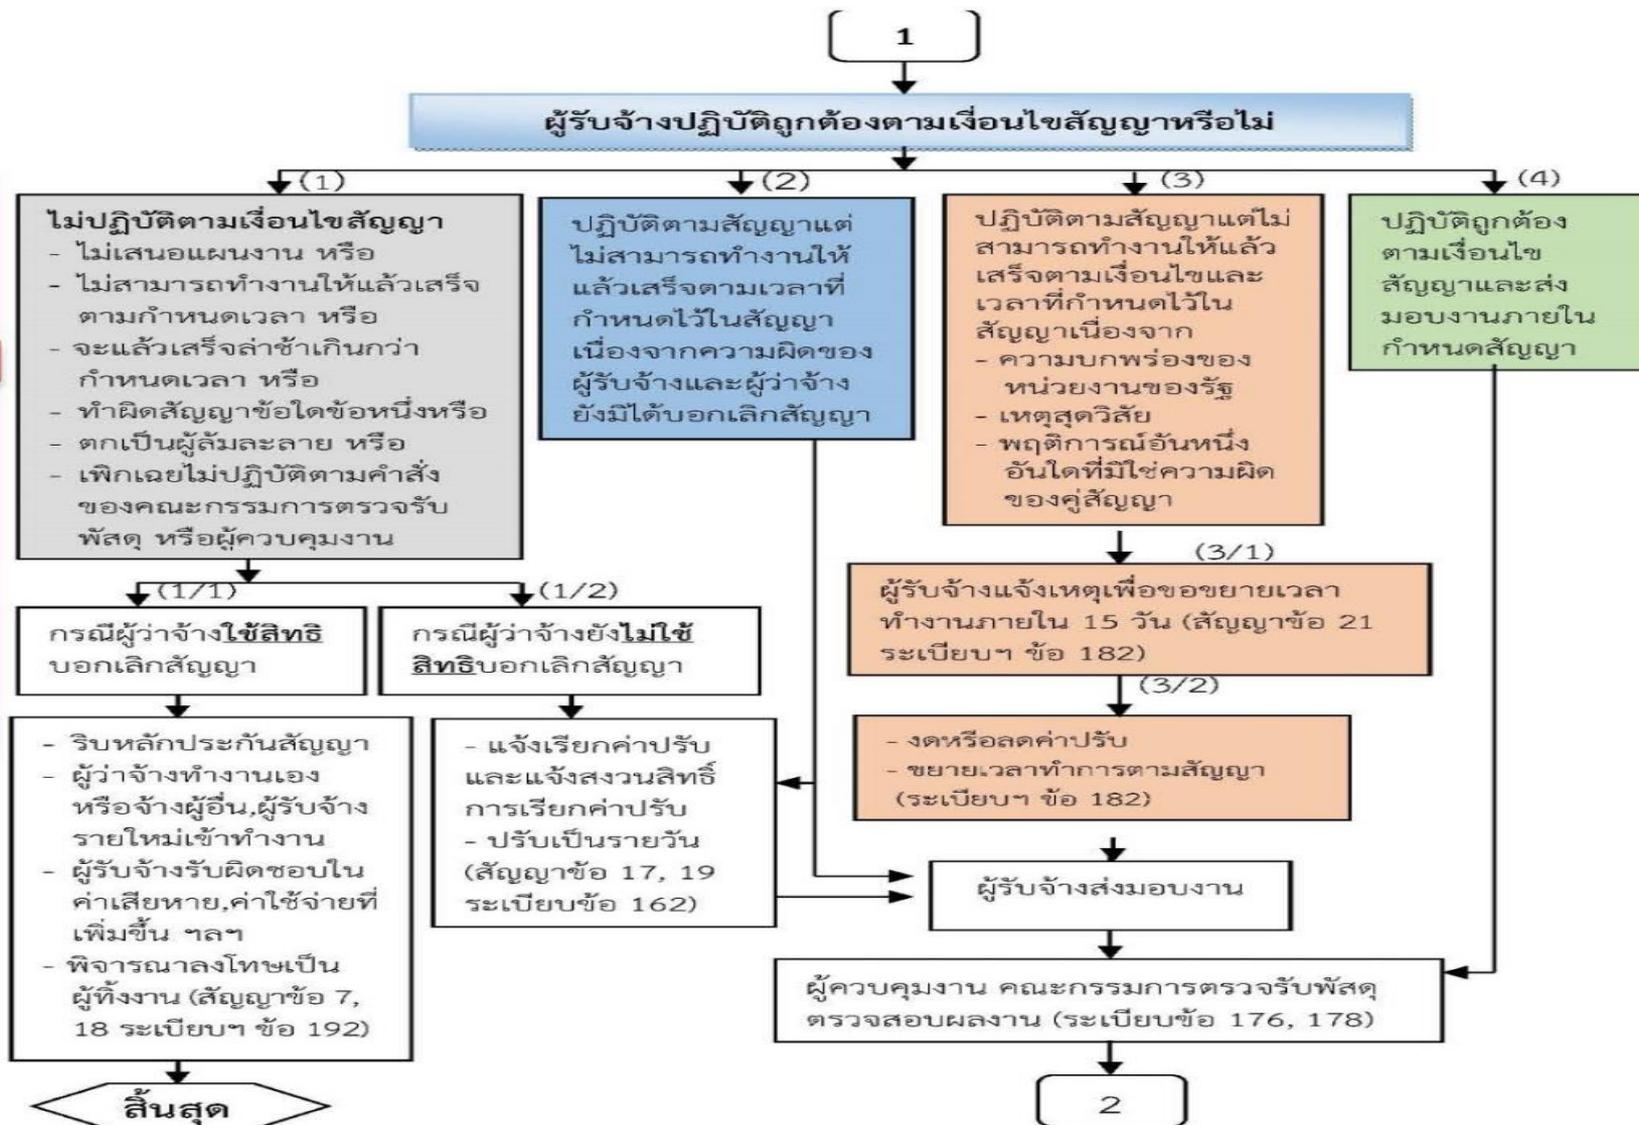



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



1.2.3 สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญา ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และยังมีได้ส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งมอบงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ


กรณีที่มีค่าปรับ สัญญาที่ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 และครบกำหนดหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565

จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัญญาเลขที่ ปนบ/จ.02/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินงบประมาณตามสัญญา 19,500,000 บาท

อายุสัญญา 150 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 25 เมษายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะกรรมการฯตรวจรับงานวันที่ 6 มิถุนายน 2565

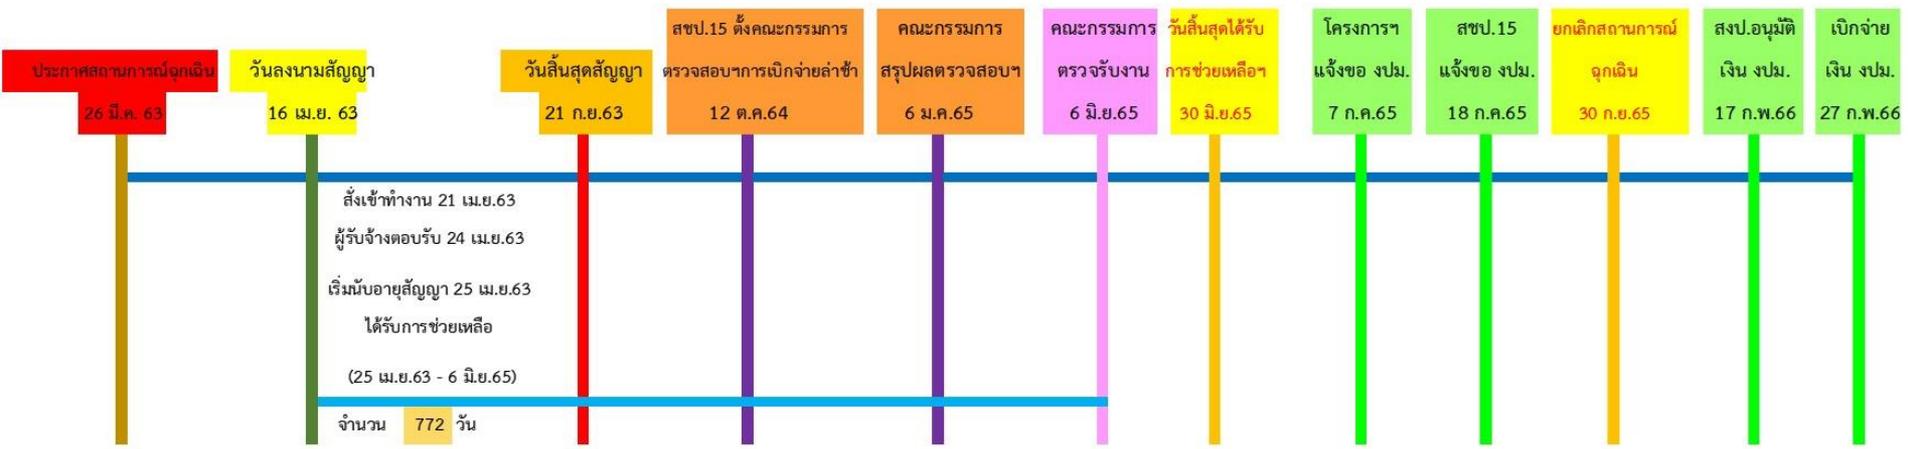



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



เลขที่เอกสารในระบบ E.กผจ04/5990/2563



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ โทร. ๒๒๒๔

ที่ กผจ ๐๔ / ๕๙๙๐ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนแหล่งงบประมาณ เพื่อสมทบจ่ายงบประมาณก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / โครงการ / ศูนย์ / กลุ่ม

ตามที่ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๕ บัญญัติให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้มีการก่อนผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จากการตรวจสอบรายการที่ได้มีการก่อนผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว พบว่ามีรายการที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นผลให้งบประมาณดังกล่าวถูกพับไป ซึ่งจำเป็นต้องขอรับงบประมาณเพื่อมาสมทบจ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป

ดังนั้น หากหน่วยงานปฏิบัติมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสมทบจ่ายงบประมาณรายการที่ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอรับการพิจารณาแหล่งงบประมาณมาดำเนินการ รายละเอียด ดังนี้

๑. หนังสือการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมกับขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. สำเนาเอกสารสัญญา

๓. ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน (BOC) โดยขอให้เปรียบเทียบระหว่างปริมาณงานที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วกับปริมาณงานที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๔. สำเนาใบแจ้งหนี้

๕. สถานภาพการได้รับงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานปฏิบัติจัดส่งเอกสารข้างต้นให้กองแผนงานโดยตรง พร้อมทั้งลงนามกำกับสำเนาเอกสารทุกฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์)
ผด.กษ. รักษาราชการแทน อชช.

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๑๕
ที่ ๓๑ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ มีรายการงบประมาณที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายจากคลังแล้ว และไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นผลให้งบประมาณถูกพับไป จำเป็นต้องขอรับงบประมาณเพื่อมาสมทบจ่ายงบประมาณ ต่อไป

รายการงบประมาณดังกล่าว ได้แก่

๑. อาคารอำนวยการช่วยเหลือชนชาติ ๒.๐๐x๒.๐๐ เมตร ๑ ช่อง พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๒,๑๓๔,๕๐๐ บาท
๒. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชาวนา จำนวน ๑ ช่อง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับโน ความจุ ๘.๐๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๑๔,๕๓๔,๗๐๗,๗๕๕ บาท

เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนแผนงาน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. นิติกร สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่...

-๒-

อำนาจหน้าที่

๑. เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 ๒. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายปริญญา สักคนายก)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ โทร. ๓๐๐, ๓๑๒

ที่ สชป ๑๕.๐๔/ ๓ /๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบขังเหตุผลข้อเท็จจริง กรณีหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผส.ชป.๑๕

ตามที่ สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามเอกสารแนบ ๑ นั้น

ตามหนังสือ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ที่ สชป ๑๕.๐๔/๕๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอบขังประชุมกรณีหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละโครงการ ซึ่งได้สรุปผลการประชุมตามเอกสารแนบ ๓ นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเหตุผล กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชานา จำนวน ๑ ช่อง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สัญญาเลขที่ ปนบ.จ.๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๑๕๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ งบประมาณถูกขับไปทั้งหมดแล้ว ปัจจุบันผลงานก่อสร้างคิดเป็น ๙๐% ปัญหาที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้าคือ ทางการฯ เข้าดำเนินการล่าช้า ประมาณ ๓ เดือน และมีฝนตกหนักในพื้นที่ แต่ไม่มีประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน รวมไปถึงปัญหา Covid-๑๙ โดยปัจจุบันรายงานงานบางส่วนยังไม่ดำเนินการ เช่น งานติดตั้งบานระบาย เครื่องสูบน้ำ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเสร็จ ๑๐๐% ประมาณเดือน เมษายน ๒๕๖๕

๒. โครงการแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับโน ความจุ ๘.๐๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สัญญาเลขที่ กจ.๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ ๖๓,๘๐๐,๐๐๕ บาท อายุสัญญา ๑๘๐ วัน เริ่มวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ๔๙,๒๖๐,๒๙๗.๒๕ บาท งบประมาณถูกขับไป ๑๕,๕๓๙,๗๐๗.๗๕ บาท ปัจจุบันผลการดำเนินงานคิดเป็น ๘๖.๓๒% ปัญหาที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้าคือ พื้นที่ก่อสร้างเป็นดินอ่อน ดินป่าพรุ ทำให้รถบรรทุกถมดิน

ไม่สามารถ...

ไม่สามารถใช้สัญญาได้ พื้นที่ก่อสร้างเป็นที่ลุ่มต่ำ พอฝนตกบ่อย ทำให้น้ำท่วมบ่อก่อสร้าง ไม่สามารถก่อสร้างได้ บางครั้งมีหนังสือจากหน่วยงานในพื้นที่แจ้งการระบายน้ำ จึงต้องหยุดการก่อสร้างไปก่อน และคาดการณ์ว่าจะเสร็จ ๑๐๐% ประมาณ ๒ เดือน จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ โดยที่ไม่มีฝนตกเลย

จากข้อเท็จจริงของทั้ง ๒ โครงการ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นควรให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และตรวจรับพัสดุให้เรียบร้อยก่อน จึงจะทำเรื่องของงบประมาณภายหลัง และมอบหมาย วศ.คป.ปากพยับบน สรุปประเด็นชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถเบิกจ่ายทัน ส่งให้กรรมการและเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธงคม รัตนเสถียร)

รอง ผส.ชป.๑๕

ประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ

-คุณ
- คุณ อ.ว.ร.ค.

เพื่อส่งตามเค:อ.ฉ.น.ก.น.ก.ย. ๑๖/๖

(นายปริญญา ลัดคนาเอก)

ผส.ชป.๑๕

๗ มี.ค. ๒๕๖๕

รับ นว ๑๐.๖๔, ๑๖.๑๐.๖๖

เพื่อไปติดขัดตาม หลอด/BUNN / ก.ว.น

(นายอภิศักดิ์ นิมิตรานนท์)

ผส.ชป.๑๕

-กน

(นายอุษณีย์ สุวตนะปานะ)

๗ มี.ค.

(นายอัครวิภากร นิมิตรานนท์)

ผส.ชป.๑๕

7 มี.ค. 2565



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E สขป15.11/๘61

ส่วนแผนงาน
รับที่ ๒๐๑๐.๒๕
วันที่ - ส.ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๒๕.๔๗ น.

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ฝ่ายวิศวกรรม โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๕๒๕๕
 ที่ สขป.๑๕.๑๑ / ๒๖๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสับสนับงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผอ.ชป.๑๕

ตามที่สัญญาเลขที่ ปนบ./จ.๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์นิ ท่างานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งโดนพับไปโดยผลของกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับพัสดุทั้งสัญญาแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ พิจารณาสับสนับงบประมาณ จำนวน ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


 (นายประวีต ชัครานนท์)
 ผอ.ชป.๑๕

รับ ๑๐.๐๒.๒๖
 เพื่อไปขอโอนงบวิศวกรรม/อกรร/อกรร
 ๑๑.๑๒.๒๖


 (นายเกริกศักดิ์ สีตานนท์)

ผอ.ชป.๑๕
 - ส.ก.ค. ๒๕๖๕


 (นายภูษงค์ สุวรรณปากพรก)
 ผอ.ชป.๑๕



บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E สขป ๑๖/๑๗๖ / ๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ส่วนแผนงาน โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๕๓๐๘
 ที่ สขป ๑๕/๕๓๓ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสมทบจ่ายงบประมาณที่ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผอ.ผ.

เรื่องเดิม

ตามที่สัญญาเลขที่ ปนบ./จ.๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ กรมฯ ว่าจ้างห้างหุ้นส่วน จำกัดอนันต์นิ ท่างานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๒. สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามคำสั่งที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบ ๑

๓. ตามหนังสือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ที่ สขป ๑๕.๑๑/๖๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอสับสนับงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุทั้งสัญญา ตามเอกสารแนบ ๒

ข้อพิจารณา

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสมทบจ่ายงบประมาณที่ถูกพับไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


 (นายปริญญา ลัดคนายก)
 ผอ.ชป.๑๕

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ นร ๐๗๐๗/๒๕๖๓

สำนักงบประมาณ

- ๒ -

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กช ๐๓๐๓.๐๔/๑๑๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๒. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงศ์ที่ ๑ ครั้งที่ ๘
เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๑๑๒๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมชลประทานขออนุมัติโอนเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากรายการห้ามบดินห้วงงานและอาคารประกอบ ความจุ ๘๐.๗๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ตามเอกสารที่อ้างถึง ๒ ซึ่งมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชาวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เบิกไม่ทันและถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย และมีหนี้ต้องชำระตามสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการจ้างแล้ว ทั้งนี้ กรมชลประทานรับรองว่าการโอนเงินจัดสรรครั้งนี้ไม่ทำให้เป้าหมาย ผลผลิต โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ และไม่ทำให้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งไม่มีภาระเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กรมชลประทานเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แผนงาน โครงการ งบรายจ่าย และรายการดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่พับไป และมีหนี้ต้องชำระตามสัญญา รายการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชาวนา จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๐.๗๐ ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้กรมชลประทานปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดิศกร กิจขยัน)

ผู้อำนวยการกองจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๔๓๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๙๖๔

ที่ กผง ๐๔ / ๑๐๕ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน ขอแจ้งเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเอกสารที่แนบ (แบบ ขป.-กผง.๐๑) เงินจัดสรรครั้งที่ ๑๖๔๔ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์กองแผนงาน (<http://kromchol.rid.go.th/budgets>) หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานชลประทาน/สำนัก/กอง)

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวมยุรี ศรียุดธ)

ผว.ผง.

เรียน ผส.ขป.๑๕ ผคป.นครศรีธรรมราช ผคบ.ปากพยับบน และ ผอ.กตบ.

เพื่อโปรดพิจารณา



(นายโจงวัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๑ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



1 / 1

แบบ ขป-กผง.01

รายละเอียดประกอบเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 อนุมัติเงินประจำงวดที่ 01 ครั้งที่ 0075 เลขที่เอกสาร 1000003345 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
 เลขที่ส่งออก E กผง 04 / 1005 / 2566 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เงินจัดสรร ครั้งที่ 1644

ที่	รายการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)		รหัส New GFMS Thai						หน่วยปฏิบัติ	หมายเหตุ
		ทั้งสิ้น	งบประมาณ	แหล่งเงิน	บัญชี	กิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยรับ	คลังเบิก		
1	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชานา จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	19,500,000	07003510037003220405	6611320	1208	07003660006900000	0700300127	0700300292	P8000	คบ.ปากพยับบน	



ผู้อนุมัติ (นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ฟุ้ง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



1.2.3 สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญา ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และยังมีได้ส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งมอบงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ


กรณีที่มีค่าปรับ สัญญาที่ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 และครบกำหนดหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565

จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชวนา จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัญญาเลขที่ ปนบ/จ.02/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินงบประมาณตามสัญญา 19,500,000 บาท

อายุสัญญา 150 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 25 เมษายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะกรรมการฯตรวจรับงานวันที่ 6 มิถุนายน 2565

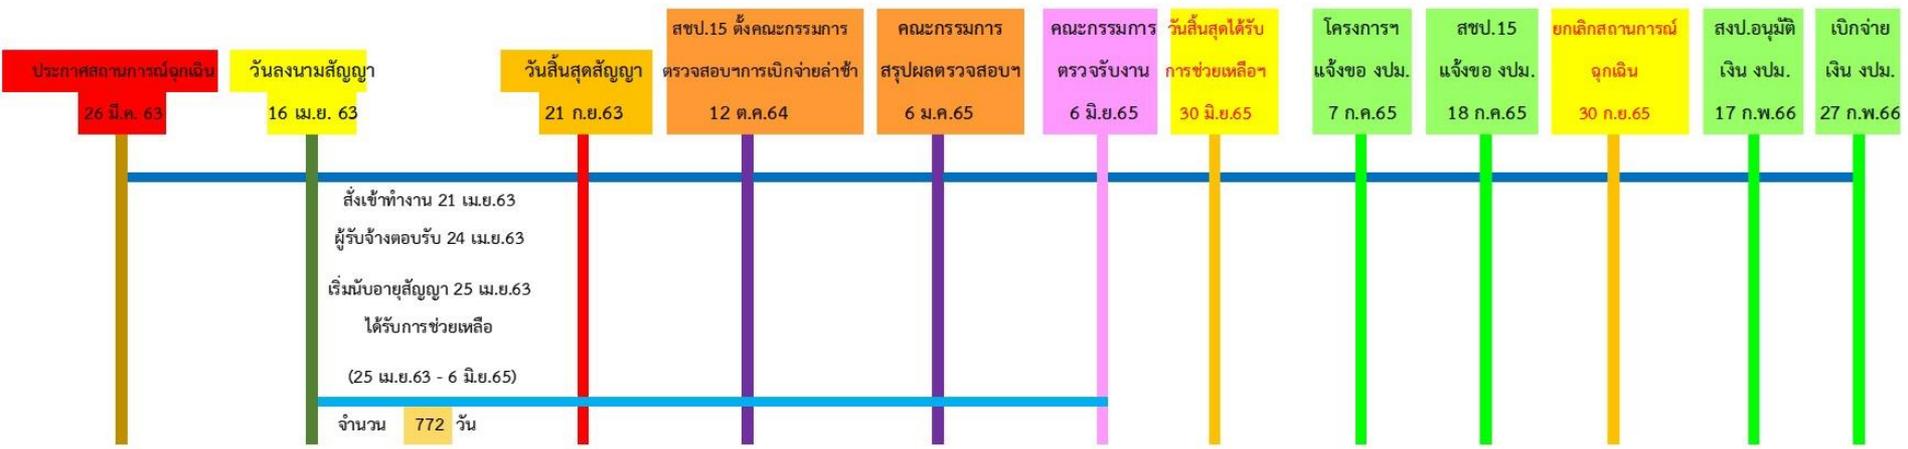



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานขุดลอกที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

ดำเนินงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์





โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน

สำนักงานชลประทานที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ขอบคุณนะครับ
